



Развитие

Акционерное
общество

Экскаваторы WK: исполнение 2024–2026 и план 2027

Данные на 14.09.2026



Главное на одной странице

28

бортов WK
3 площадки · WK-20,
WK-20C, WK-35

94%

исполнение 2024
факт 2,78 из 2,96
млрд ₽

104%

исполнение 2025
факт 3,74 из 3,58
млрд ₽

54%

исполнение 2026
на 14.09.2026: 2,13 из
3,96 млрд ₽

2,78

млрд ₽ — план
2027
+ 1,18 млрд ₽ позиций
ППР без заказа

53%

обеспеченность
2027
не покрыто 913 млн ₽;
2026 — 93%

1 **2024–2025 выполнены.** Факт 94% и 104% плана; закрыто технически и коммерчески 81% и 85% плана.

2 **2026 отстаёт от календаря.** К середине сентября освоено 54%. 604 млн ₽ деблокированы без факта, 1 119 млн ₽ ещё на согласовании.

3 **Затраты сосредоточены.** Пять бортов — WK-35 №04, WK-35 №06, WK-35 №07 и ещё два — дали 48% факта 2024–2026.

4 **2027 — главный риск по МТР.** Не покрыто 913 млн ₽; 1 184 млн ₽ закупка не видит до деблокирования. Перемещение между площадками ограничено: запасом других площадок можно улучшить ещё до 217 млн ₽.

Парк и готовность

28 экскаваторов на трёх площадках, КТГ по годам, месяцам и бортам



01

Парк WK по площадкам

Красноярск / Еруда

WK-20 × 4 · WK-35 × 13

17

Борт · книга	КТГ 2026
WK-20 №02 K1623	91%
WK-20 №03 K1623	75%
WK-20 №8 K1626	76%
WK-20 №09 нет книги	нет данных
WK-35 №04 K1839	90%
WK-35 №05 K1839	83%
WK-35 №06 K1839	87%
WK-35 №07 K1839	87%
WK-35 №10 K1849	90%
WK-35 №11 K1849	81%
WK-35 №12 K1849	92%
WK-35 №13 K1866	93%
WK-35 №14 K1849	91%
WK-35 №15 K1849	91%
WK-35 №16 K1849	91%
WK-35 №17 K1853	90%
WK-35 №18 K1853	92%

Магадан

WK-20 × 2 · WK-20C × 4

6

Борт · книга	КТГ 2026
WK-20 №1 K1626	78%
WK-20 №2 K1626	86%
WK-20C №3 K1637	92%
WK-20C №4 K1637	91%
WK-20C №5 K1637	92%
WK-20C №6 K1637	93%

Сухой Лог

WK-20 × 1 · WK-20C × 1 · WK-35 × 3

5

Борт · книга	КТГ 2026
WK-20 №1220 K1626	нет данных
WK-20C №1221 K1641	88%
WK-35 №1222 нет книги	нет данных
WK-35 №1223 нет книги	нет данных
WK-35 №1224 нет книги	нет данных


КТГ факт ≥ плана

ниже плана до 5 п.п.

ниже более чем на 5 п.п.

КТГ парка: план и факт по месяцам

Парк WK, среднее по бортам

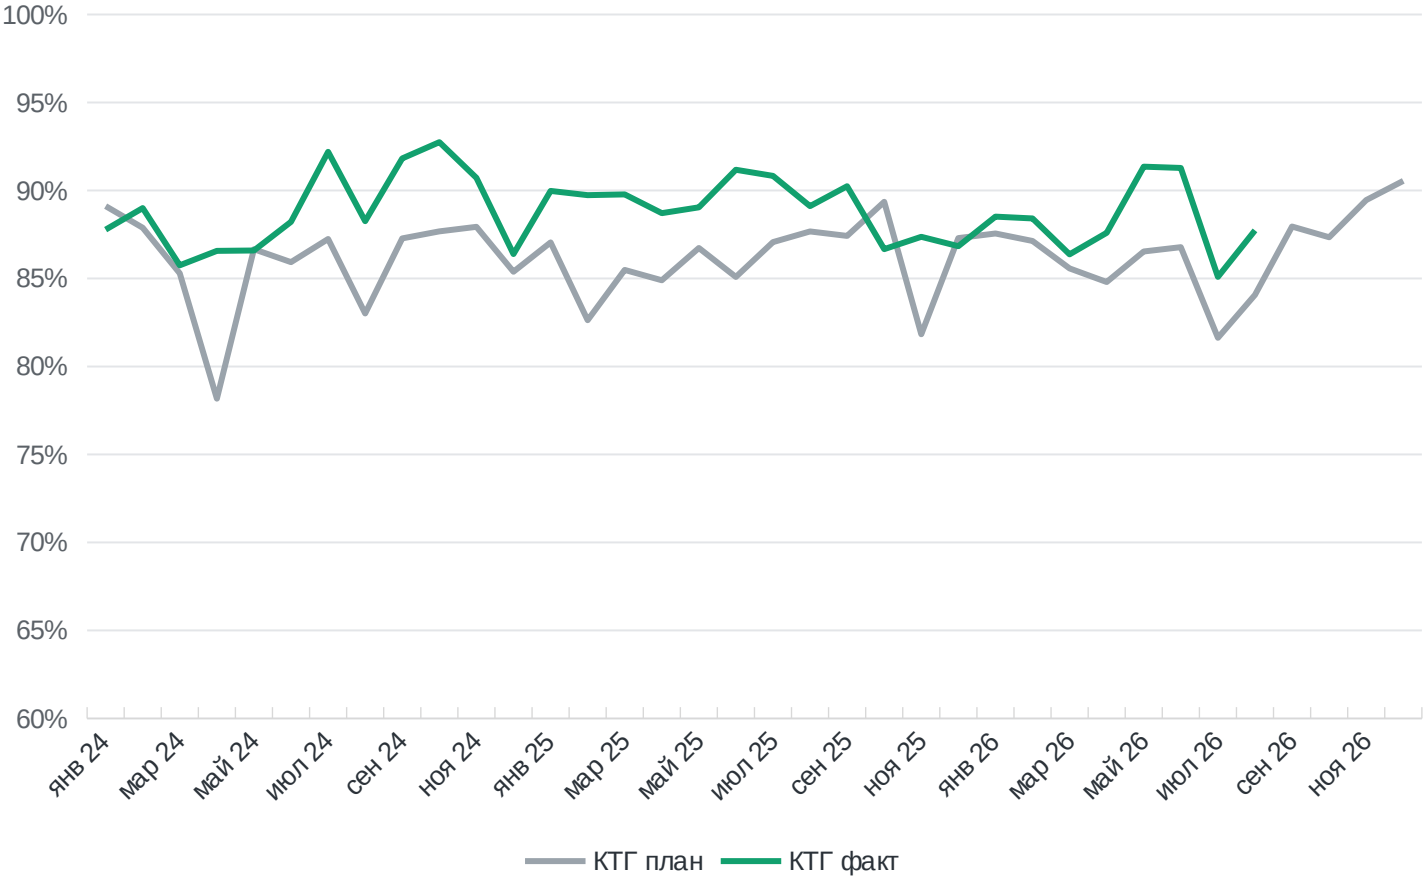

По площадкам, план / факт

Площадка	2024	2025	2026
Красноярск / Еруда	87% / 89%	86% / 89%	86% / 88%
Магадан	83% / 89%	87% / 90%	87% / 89%
Сухой Лог	86% / 63%	83% / 88%	86% / 88%

Разброс по бортам 2026

Лучший: WK-35 №13 — 93%

Худший: WK-20 №03 — 75%

Сухой Лог: КТГ факт есть не по всем бортам — WK-20 №1220 без данных с 2025 года.

КТГ по каждому борту: план и факт 2024–2026

Площадка	Борт	2024 план	2024 факт	2025 план	2025 факт	2026 план	2026 факт	Δ 2026, п.п.
Красноярск	WK-20 №02	80%	79%	83%	81%	83%	91%	+8
Красноярск	WK-20 №03	88%	80%	82%	84%	79%	75%	-5
Красноярск	WK-20 №8	84%	90%	81%	85%	85%	76%	-10
Красноярск	WK-20 №09	—	—	—	—	—	—	—
Красноярск	WK-35 №04	87%	87%	82%	85%	88%	90%	+2
Красноярск	WK-35 №05	88%	88%	88%	88%	82%	83%	+1
Красноярск	WK-35 №06	83%	81%	80%	81%	87%	87%	-0
Красноярск	WK-35 №07	86%	87%	85%	87%	87%	87%	-1
Красноярск	WK-35 №10	89%	92%	89%	92%	88%	90%	+2
Красноярск	WK-35 №11	88%	91%	82%	91%	80%	81%	+2
Красноярск	WK-35 №12	89%	92%	89%	92%	87%	92%	+5
Красноярск	WK-35 №13	—	—	—	—	89%	93%	+4
Красноярск	WK-35 №14	89%	93%	89%	91%	87%	91%	+3
Красноярск	WK-35 №15	89%	92%	89%	92%	89%	91%	+2
Красноярск	WK-35 №16	89%	92%	89%	91%	89%	91%	+2
Красноярск	WK-35 №17	89%	92%	89%	92%	89%	90%	+1
Красноярск	WK-35 №18	87%	94%	89%	91%	89%	92%	+3
Магадан	WK-20 №1	79%	82%	79%	81%	78%	78%	+0
Магадан	WK-20 №2	80%	86%	88%	90%	87%	86%	-1
Магадан	WK-20C №3	85%	95%	88%	91%	91%	92%	+1
Магадан	WK-20C №4	89%	98%	88%	94%	90%	91%	+1
Магадан	WK-20C №5	88%	97%	87%	92%	90%	92%	+2
Магадан	WK-20C №6	92%	96%	89%	93%	88%	93%	+5
Сухой	WK-20 №1220	86%	63%	—	—	—	—	—
Сухой	WK-20C №1221	—	—	83%	88%	83%	88%	+5
Сухой	WK-35 №1222	—	—	—	—	—	—	—
Сухой	WK-35 №1223	—	—	—	—	—	—	—
Сухой	WK-35 №1224	—	—	—	—	—	—	—

Исполнение 2024–2026


План и факт по годам, площадкам, моделям, видам работ и каждому борту



02

Программа ремонтов WK: план и факт по годам

млн ₽

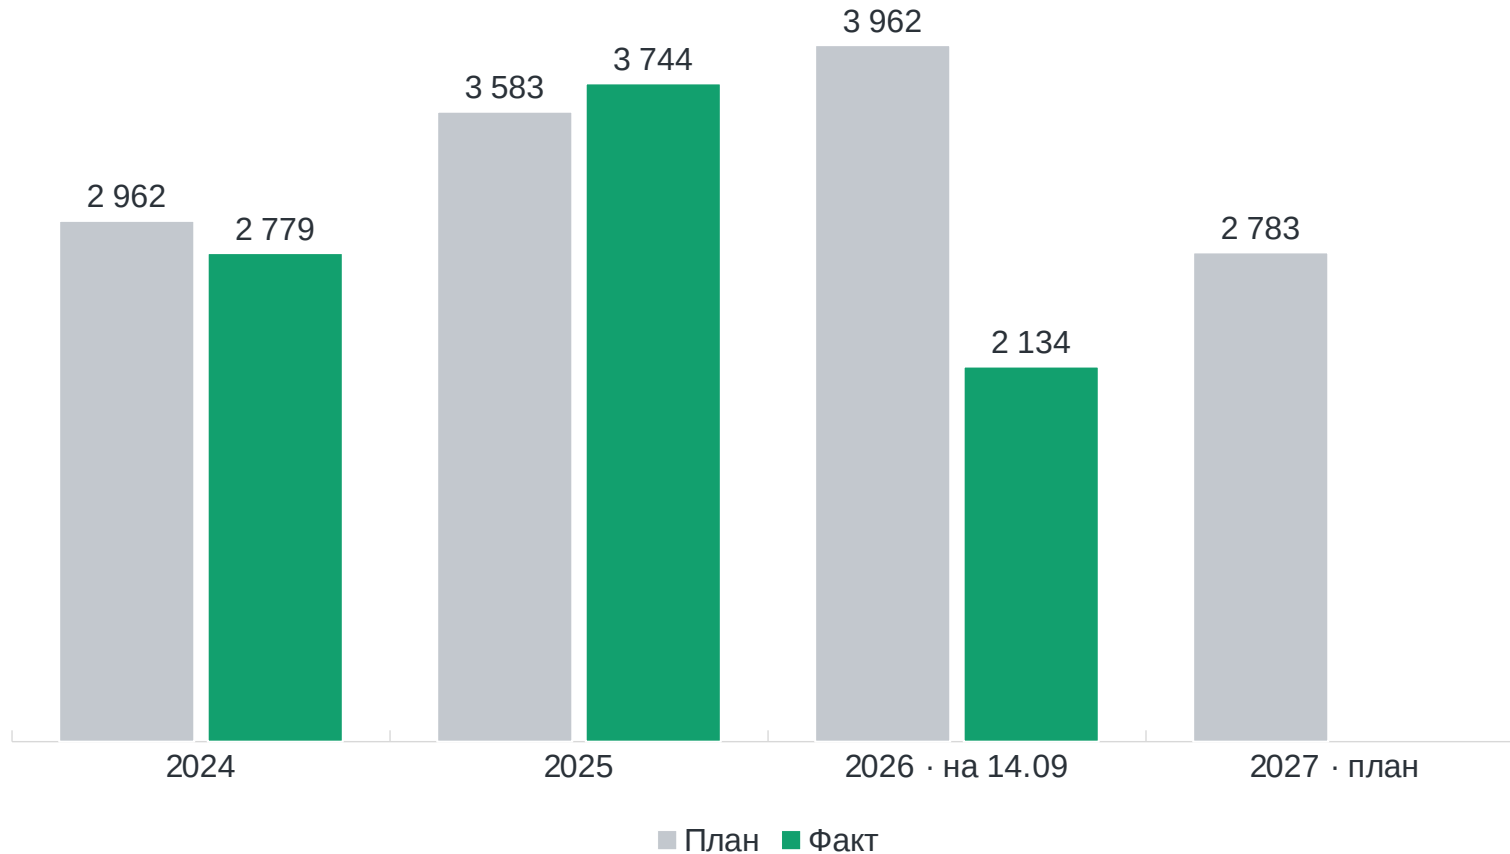

94%

исполнение 2024
закрыто 81% плана · 1 382 заказов

104%

исполнение 2025
закрыто 85% плана · 2 797 заказов

54%


исполнение 2026 на 14.09.2026
закрыто 52% плана · 2 791 заказов

2 783 млн ₽

план 2027 в заказах SAP
567 заказов · МТР 2 181 · УСО 602


Исполнение по площадкам

Красноярск / Еруда

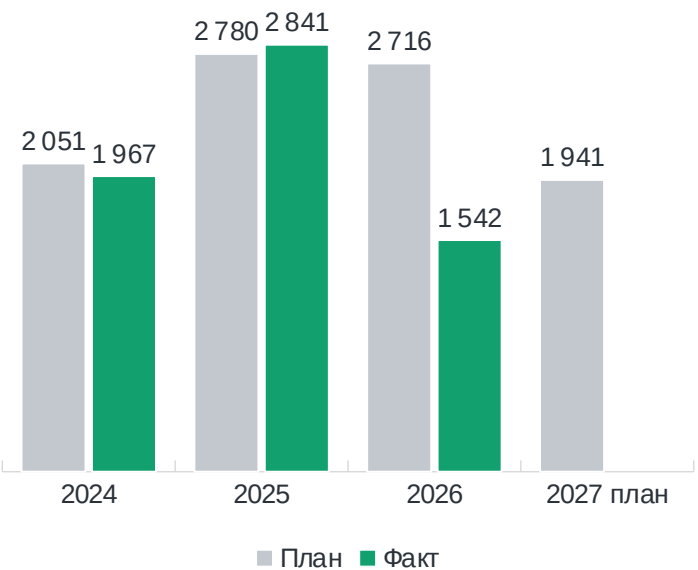


Бортов: 17 · заказов 2026: 1 798

Магадан

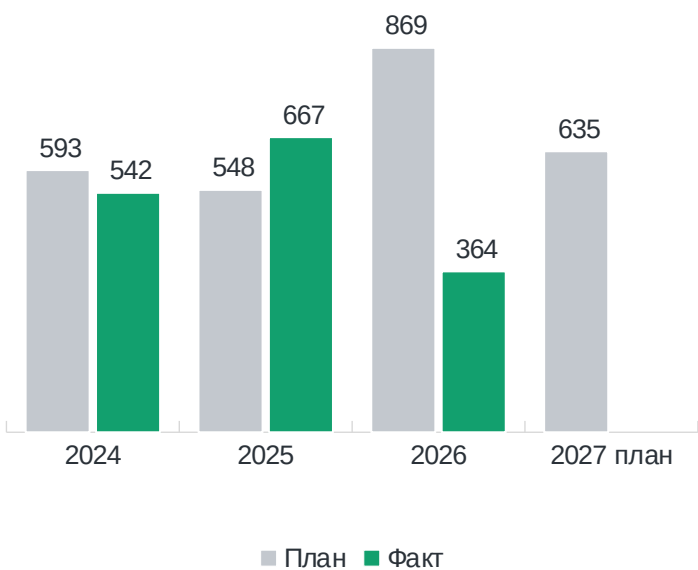

Бортов: 6 · заказов 2026: 857


Сухой Лог

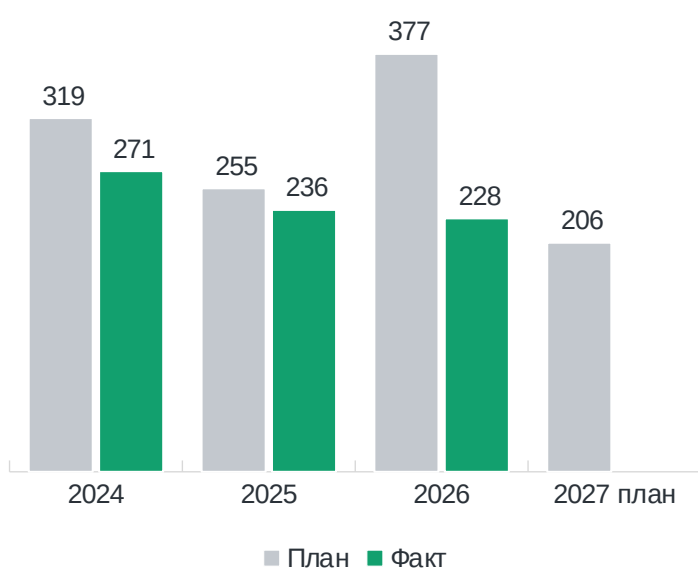


Бортов: 5 · заказов 2026: 136

Где находятся заказы: стадии SAP по годам

Все площадки, доля плана по стадиям

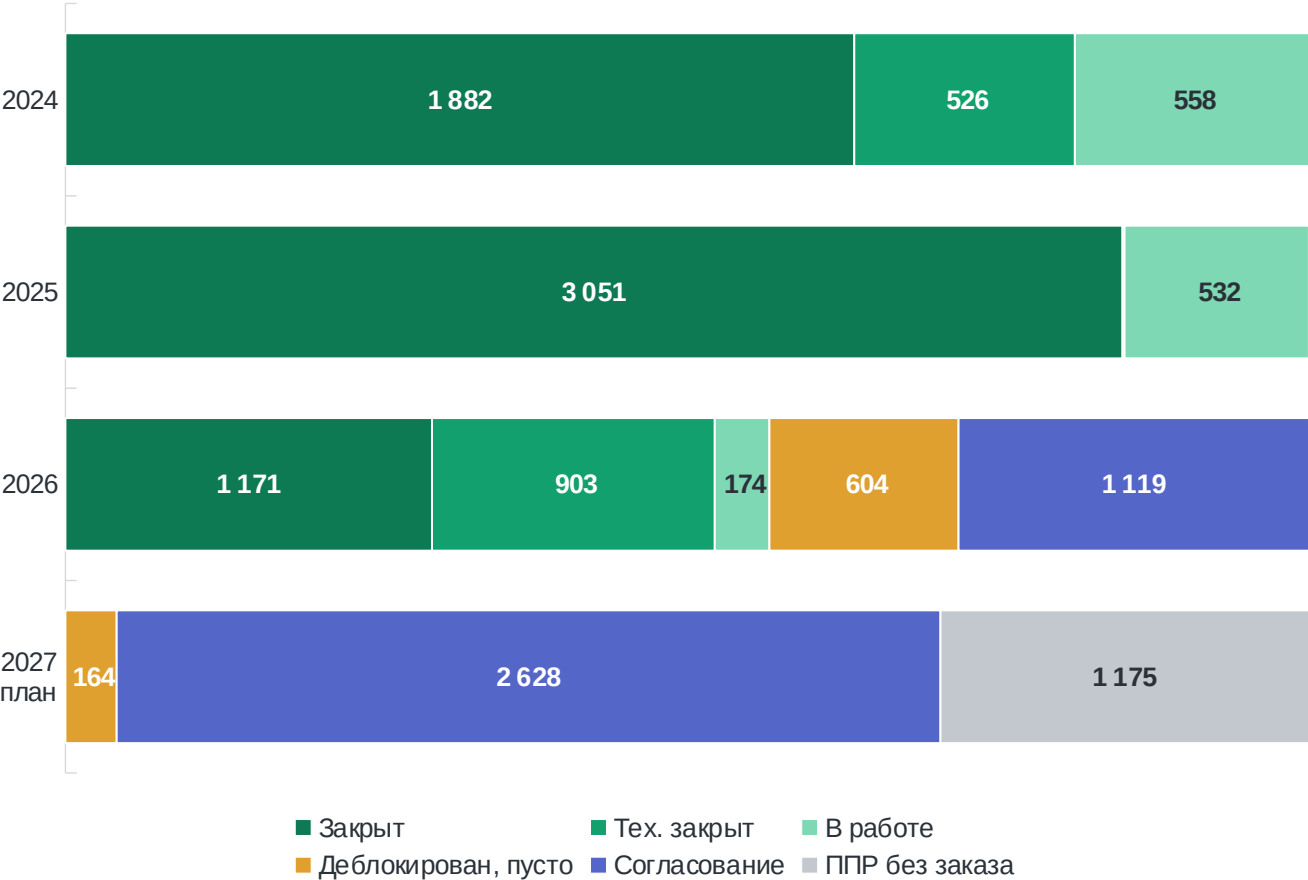


2026 по площадкам, доли; подписи — млн ₽

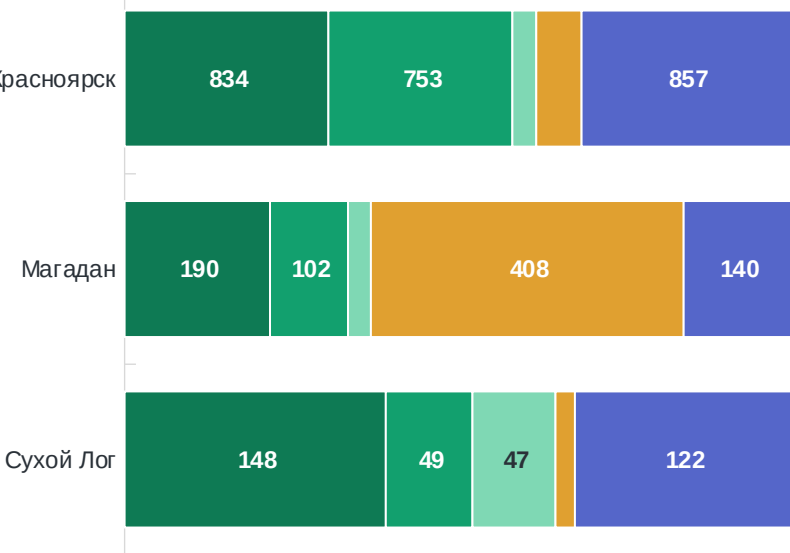

604 млн ₽ — 111 заказов 2026 деблокированы, но без факта и подтверждений.
1 119 млн ₽ на согласовании в сентябре: пересмотрите, что реально выполнится до конца года.

На что уходят деньги: виды работ и модели

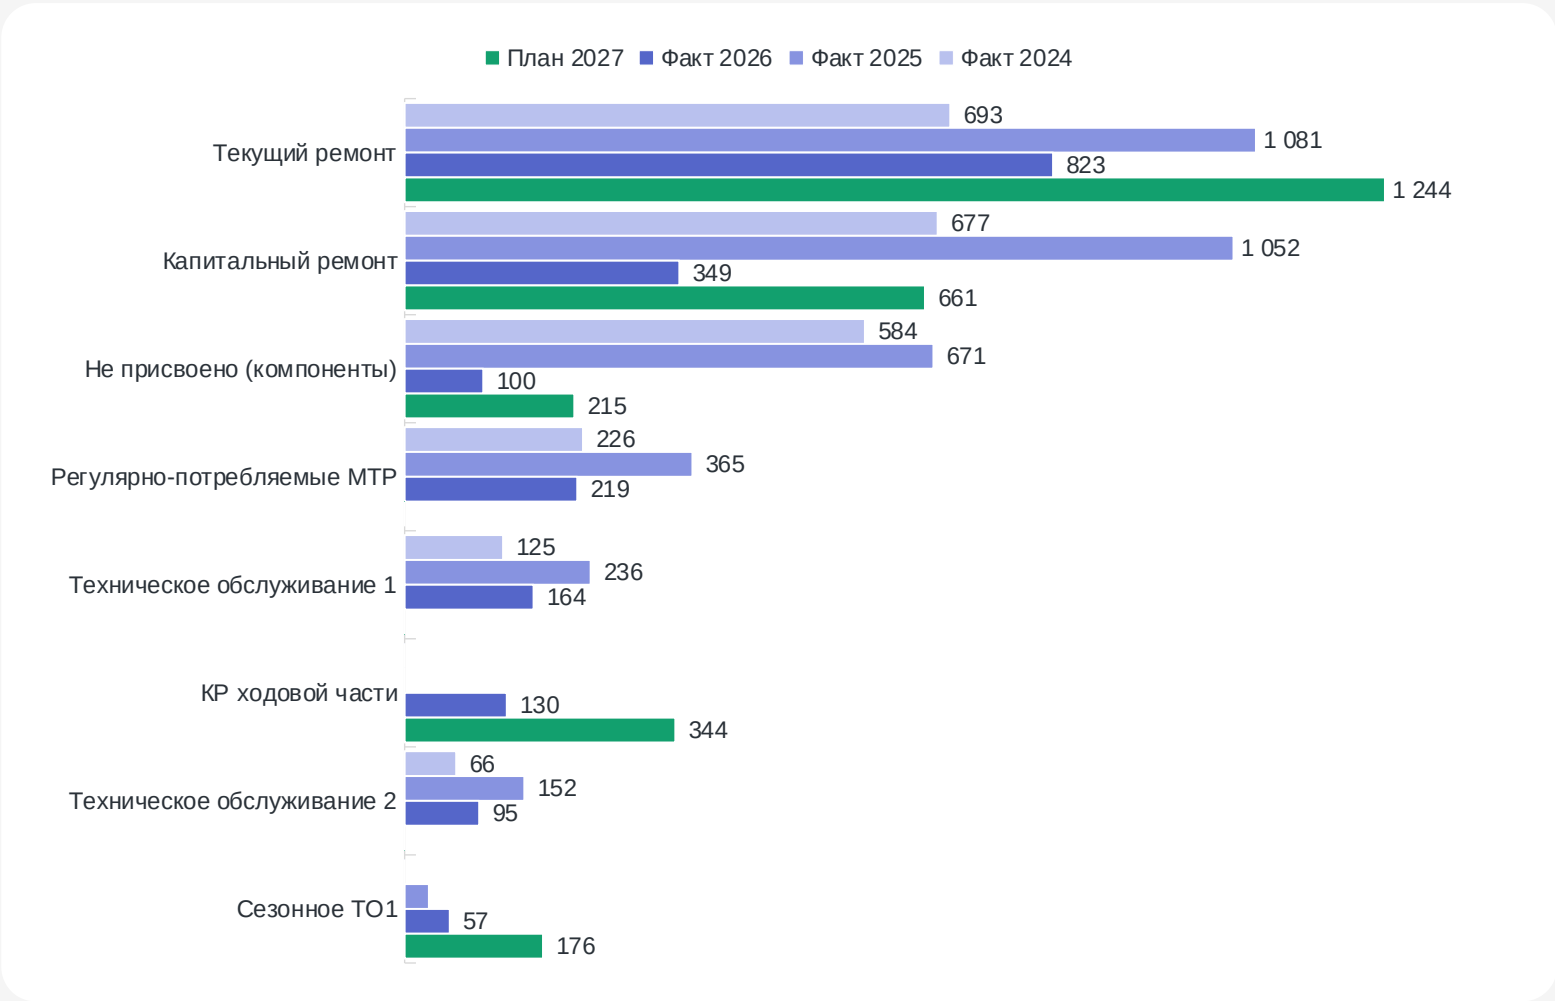

Исполнение по моделям


Модель	2024	2025	2026	План 27
WK-20	92%	106%	40%	701
WK-20C	89%	117%	69%	342
WK-35	97%	102%	63%	1 740

По статье затрат, факт 2024–2026

ОРЕХ (ремонт и ТО)



ОРЕХ УПА (CAPEX Рудных БЕ)




Компоненты



Затраты на каждый борт: факт 2024–2026

■ Факт 2024 ■ Факт 2025 ■ Факт 2026

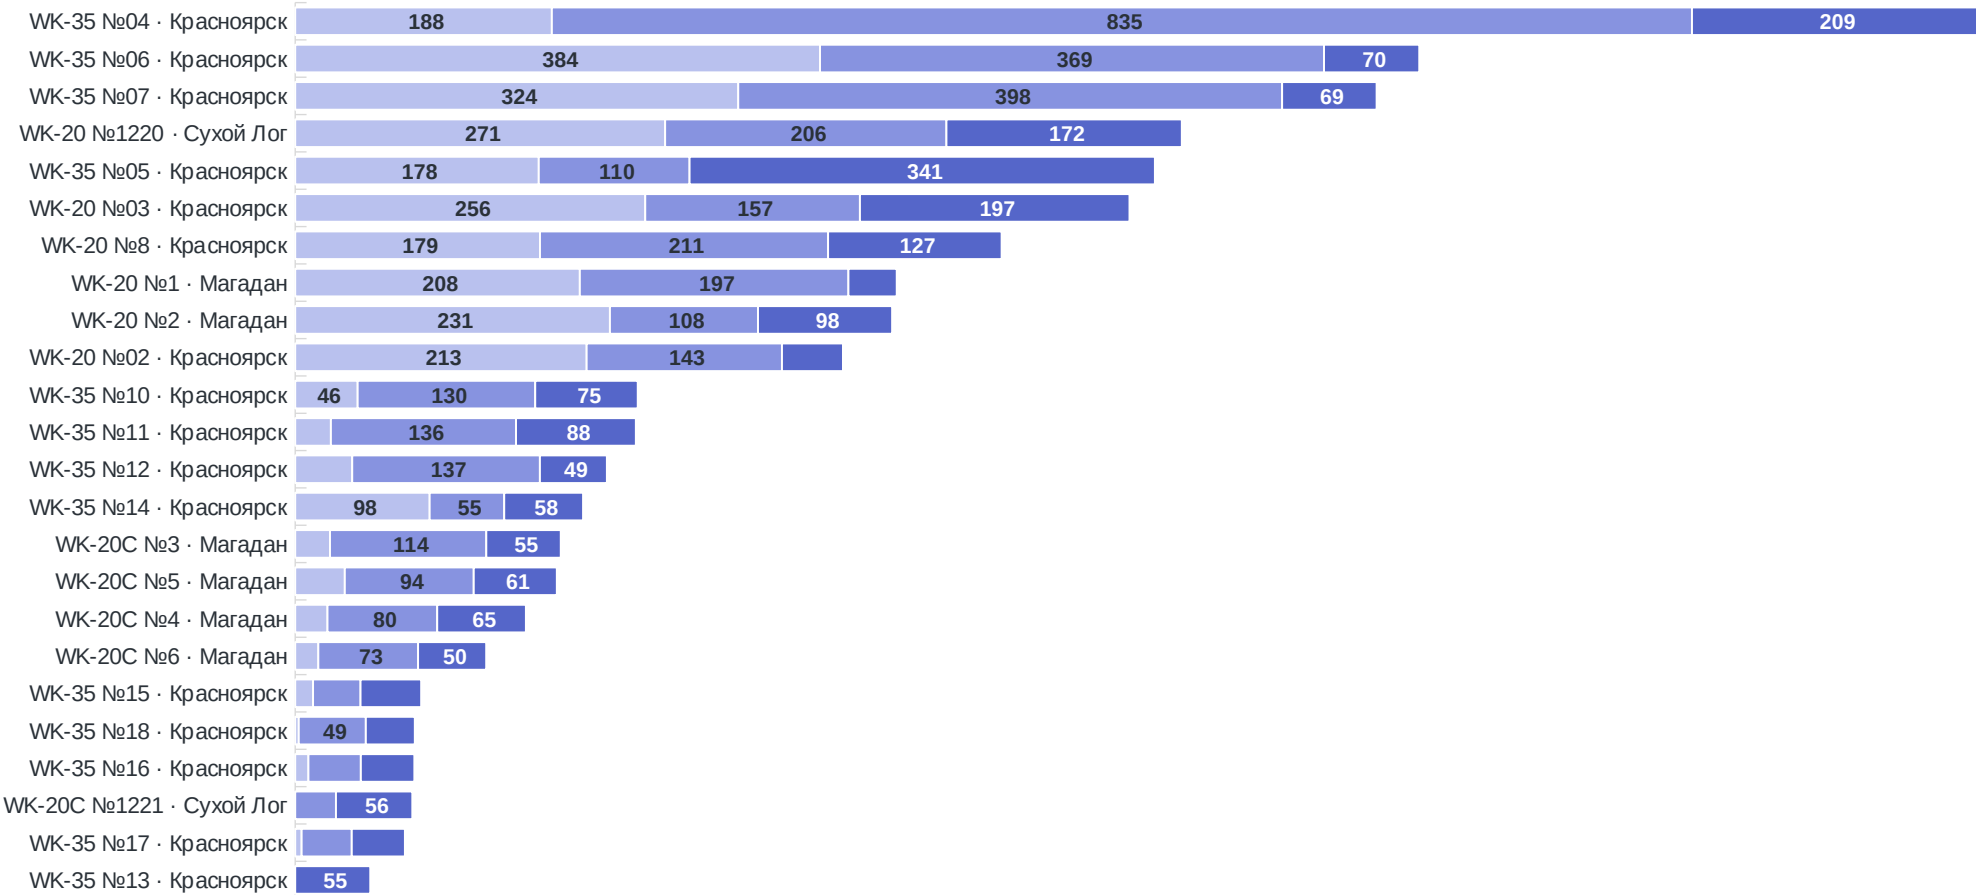

Исполнение по бортам: Красноярск / Еруда

Площадка	Борт	План 24	Факт 24	%	План 25	Факт 25	%	План 26	Факт 26	%	План 27	ППР 27*	Обесп. 27	КТГ 26
Красноярск	WK-20 №02	214	213	100%	136	143	105%	317	45	14%	33	43	68%	91%
Красноярск	WK-20 №03	295	256	87%	146	157	107%	379	197	52%	38	43	78%	75%
Красноярск	WK-20 №8	178	179	101%	213	211	99%	166	127	77%	130	47	45%	76%
Красноярск	WK-20 №09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Красноярск	WK-35 №04	194	188	97%	741	835	113%	303	209	69%	45	46	61%	90%
Красноярск	WK-35 №05	214	178	83%	116	110	95%	438	341	78%	52	47	51%	83%
Красноярск	WK-35 №06	391	384	98%	412	369	90%	99	70	70%	252	45	90%	87%
Красноярск	WK-35 №07	308	324	105%	416	398	96%	93	69	74%	421	46	66%	87%
Красноярск	WK-35 №10	57	46	81%	120	130	108%	140	75	54%	72	46	66%	90%
Красноярск	WK-35 №11	31	26	83%	114	136	118%	133	88	66%	60	46	65%	81%
Красноярск	WK-35 №12	43	42	96%	136	137	101%	211	49	23%	59	46	45%	92%
Красноярск	WK-35 №13	—	—	—	—	—	—	83	55	67%	23	46	54%	93%
Красноярск	WK-35 №14	97	98	102%	56	55	98%	83	58	69%	103	46	84%	91%
Красноярск	WK-35 №15	12	13	109%	43	35	80%	71	44	62%	184	46	47%	91%
Красноярск	WK-35 №16	9	10	103%	40	38	95%	66	39	60%	191	46	34%	91%
Красноярск	WK-35 №17	4	5	110%	40	37	92%	69	39	56%	168	46	23%	90%
Красноярск	WK-35 №18	2	3	122%	50	49	97%	66	36	55%	111	45	10%	92%

млн ₽. * ППР 27 — позиции графика ППР без заказа SAP, в план не входят. Обесп. 27 — доля потребности МТР 2027, покрытая складом и закупкой к сроку. КТГ 26 — факт январь–август.

Исполнение по бортам: Магадан и Сухой Лог

Площадка	Борт	План 24	Факт 24	%	План 25	Факт 25	%	План 26	Факт 26	%	План 27	ППР 27*	Обесп. 27	КТГ 26
Магадан	WK-20 №1	240	208	87%	157	197	126%	412	35	9%	79	42	57%	78%
Магадан	WK-20 №2	238	231	97%	88	108	123%	149	98	66%	303	40	59%	86%
Магадан	WK-20C №3	30	26	85%	106	114	108%	73	55	75%	95	41	79%	92%
Магадан	WK-20C №4	29	24	82%	66	80	121%	79	65	82%	72	41	75%	91%
Магадан	WK-20C №5	38	36	95%	78	94	122%	75	61	81%	64	43	59%	92%
Магадан	WK-20C №6	18	17	96%	54	73	135%	82	50	61%	22	41	60%	93%
Сухой Лог	WK-20 №1220	319	271	85%	224	206	92%	273	172	63%	118	40	25%	—
Сухой Лог	WK-20C №1221	—	—	—	32	30	94%	104	56	54%	88	40	32%	88%
Сухой Лог	WK-35 №1222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—
Сухой Лог	WK-35 №1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—
Сухой Лог	WK-35 №1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—
Сухой Лог	WK-35 №1228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—

млн ₽. * ППР 27 — позиции графика ППР без заказа SAP, в план не входят. Обесп. 27 — доля потребности МТР 2027, покрытая складом и закупкой к сроку. КТГ 26 — факт январь–август.

Крупнейшие материалы: факт 2024–2026

№	ЕКМТР	Наименование	Кол-во	Факт, млн ₽	
1	976755	Ковш СБ K1839.01.00 TZ	9	666	
2	1248033	Смазка Синтофлекс Арктик 1-100 HD Лукойл	282 552	401	
3	948715	Канат подъем.K1801.05.10.00 TZ	510	315	
4	985386	Смазка Карбофлекс OG 000-1500 HD Лукойл	152 105	237	
5	1101027	Цепь гусеничной ленты K1605.18.04.00 TZ	8	229	
6	975552	Каток опор.K1605.18.03.00 TZ	99	191	
7	953566	Пластина гусеничной ленты K1812.18.04.01	255	173	
8	889503	Ковш СБ K1623.01.00 TZ	3	161	
9	975772	Вал подъем.промежут.K1801.05.03.00 TZ	14	143	
10	1116816	Каток опорный K1801.18.03.00 TZ	64	130	
11	975558	Колесо напр.перед.K1605.18.05.00 TZ	18	112	
12	1291661	Смазка Карбофлекс OG 0-4000 HD Лукойл	63 037	105	

План 2027


Объём, готовность заказов, разрез по площадкам и бортам, крупнейшие МТР



03

План 2027: объём и готовность заказов

По площадкам, млн ₹

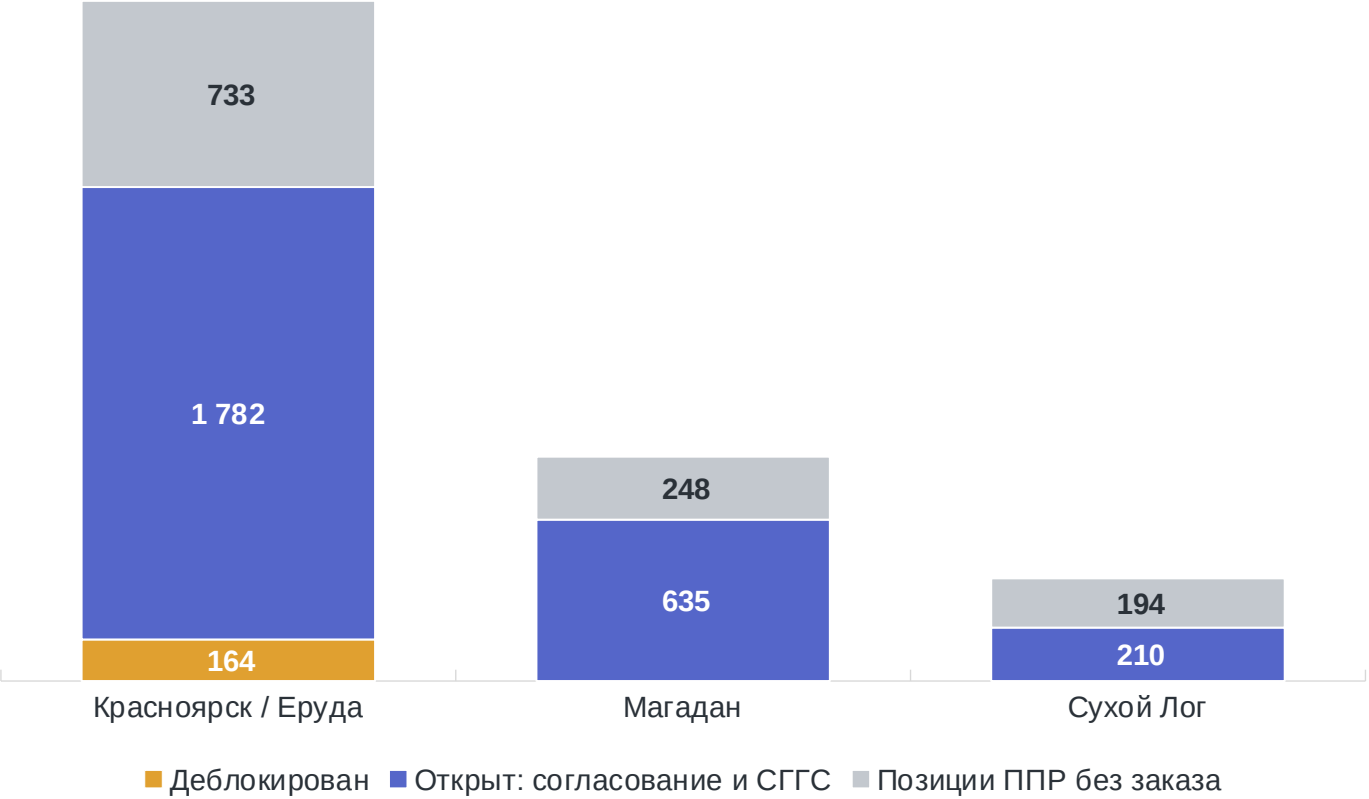

2 783 млн ₹

план 2027 в заказах SAP
567 заказов · из них 94% ещё открыты

1 175 млн ₹


позиции ППР без заказа
770 позиций · не входят в план

602 млн ₹

из плана — МТР подрядчика (УСО)
Магадан: 528 млн ₹

Деблокировано 164 млн ₹ — остальное закупка увидит только после ДЕБЛ, если у строк «Начиная с деблок.».

План 2027 по бортам

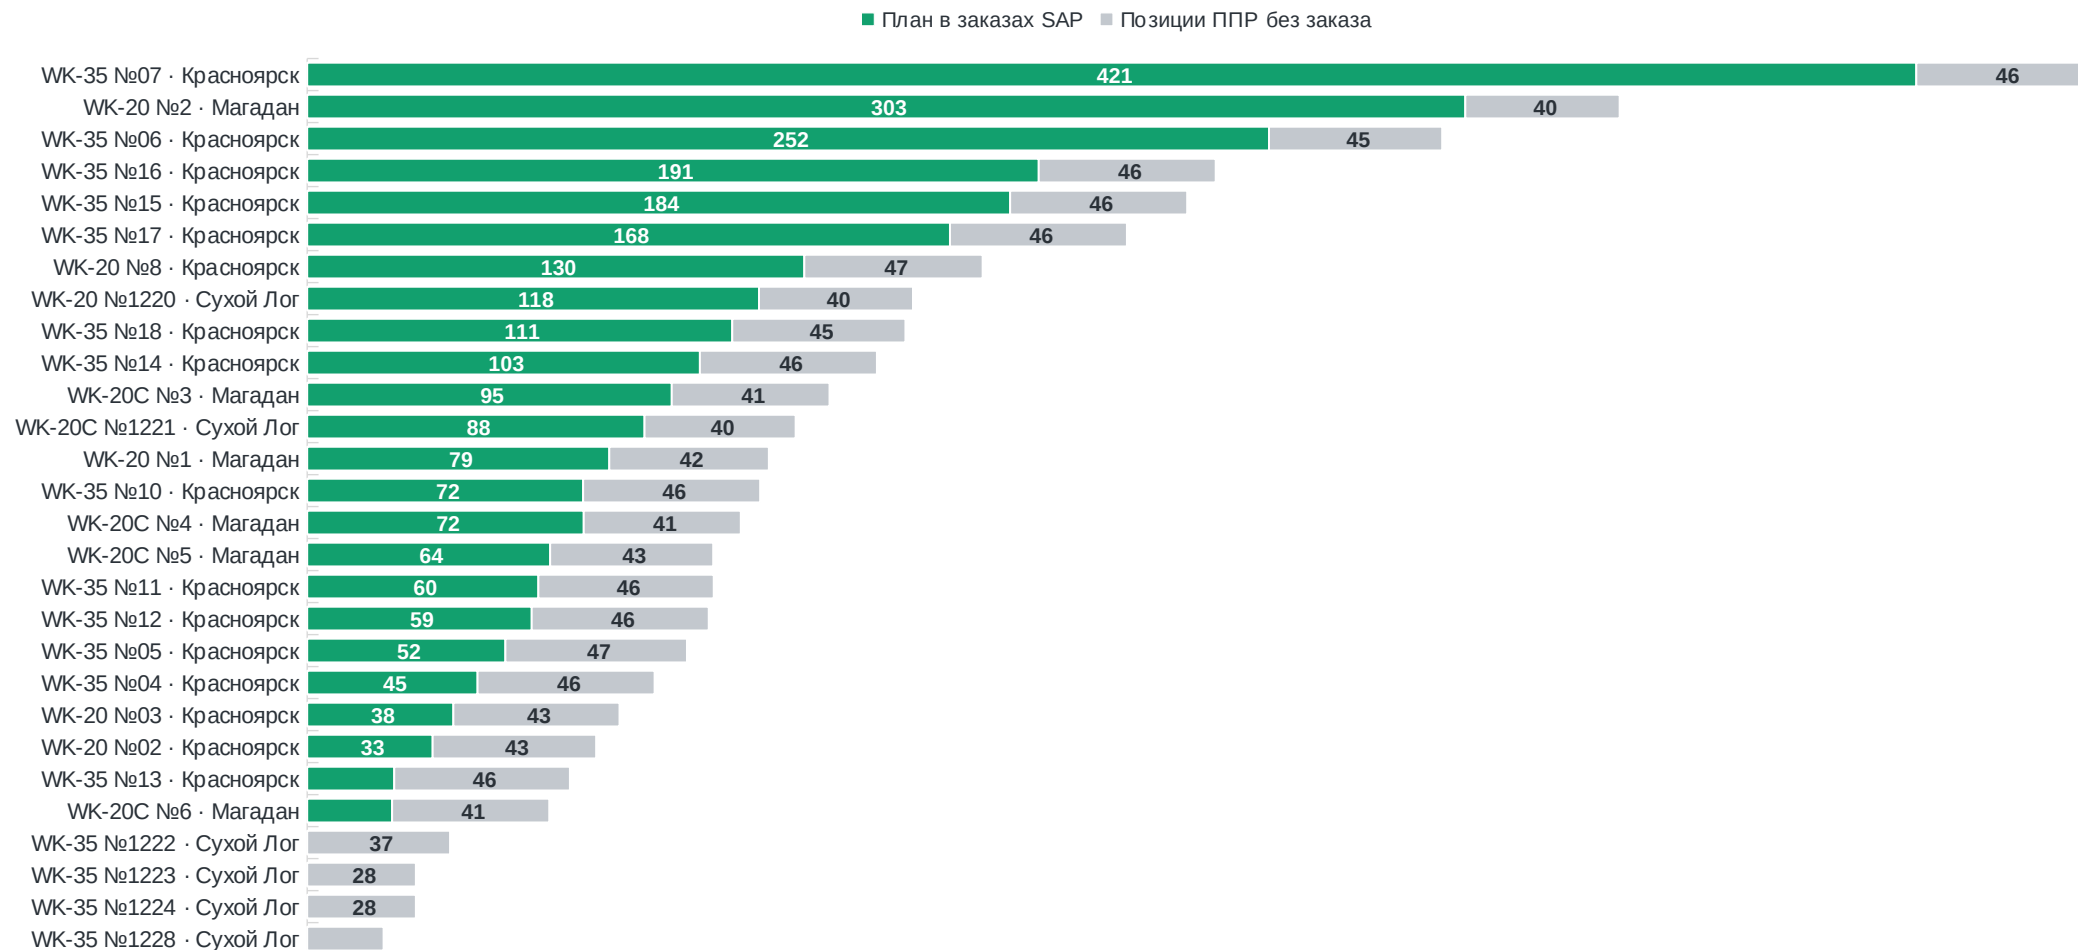

Крупнейшие МТР плана 2027 и их обеспеченность

№	ЕКМТР	Наименование	Бортов	Кол-во	План, млн ₽	Обеспечено	Вывод
1	976755	Ковш СБ K1839.01.00 TZ	3	3	164	25%	не успеем
2	948715	Канат подъем.K1801.05.10.00 TZ	13	234	134	82%	не успеем
3	975783	Вал поворот.вертик.K1801.07.01.00 TZ	10	20	120	35%	не успеем
4	1335553	Масло редук. Sypres Extra 220 Teboil	20	112 586	116	—	—
5	1116816	Каток опорный K1801.18.03.00 TZ	5	80	102	38%	успеем заказать
6	961124	Коронка зубца K1802.01.10.00-12 TZ	20	1 356	73	66%	не успеем
7	1129639	Цепь гусеничной ленты K1812.18.04.00 TZ	1	2	61	—	—
8	1230357	Колесо натяжное СБ K1842.18.05.00 TZ	6	12	60	81%	успеем заказать
9	961123	Зубцедержатель K1802.01.10.00-11 TZ	14	258	58	75%	не успеем
10	1174071	Шестерня венцовая K1801.15.03.00 TZ	2	2	56	100%	обеспечено
11	920820	Стак.фильтр.K1838.22.01 TZ	13	1 872	54	34%	не успеем
12	1195742	Стрела K1801.03.15.00 TZ	1	1	52	0%	не успеем


Обеспеченность МТР 2026–2027

Склад, закупка, дефицит — по годам, площадкам и бортам



04

Обеспеченность потребности WK по годам

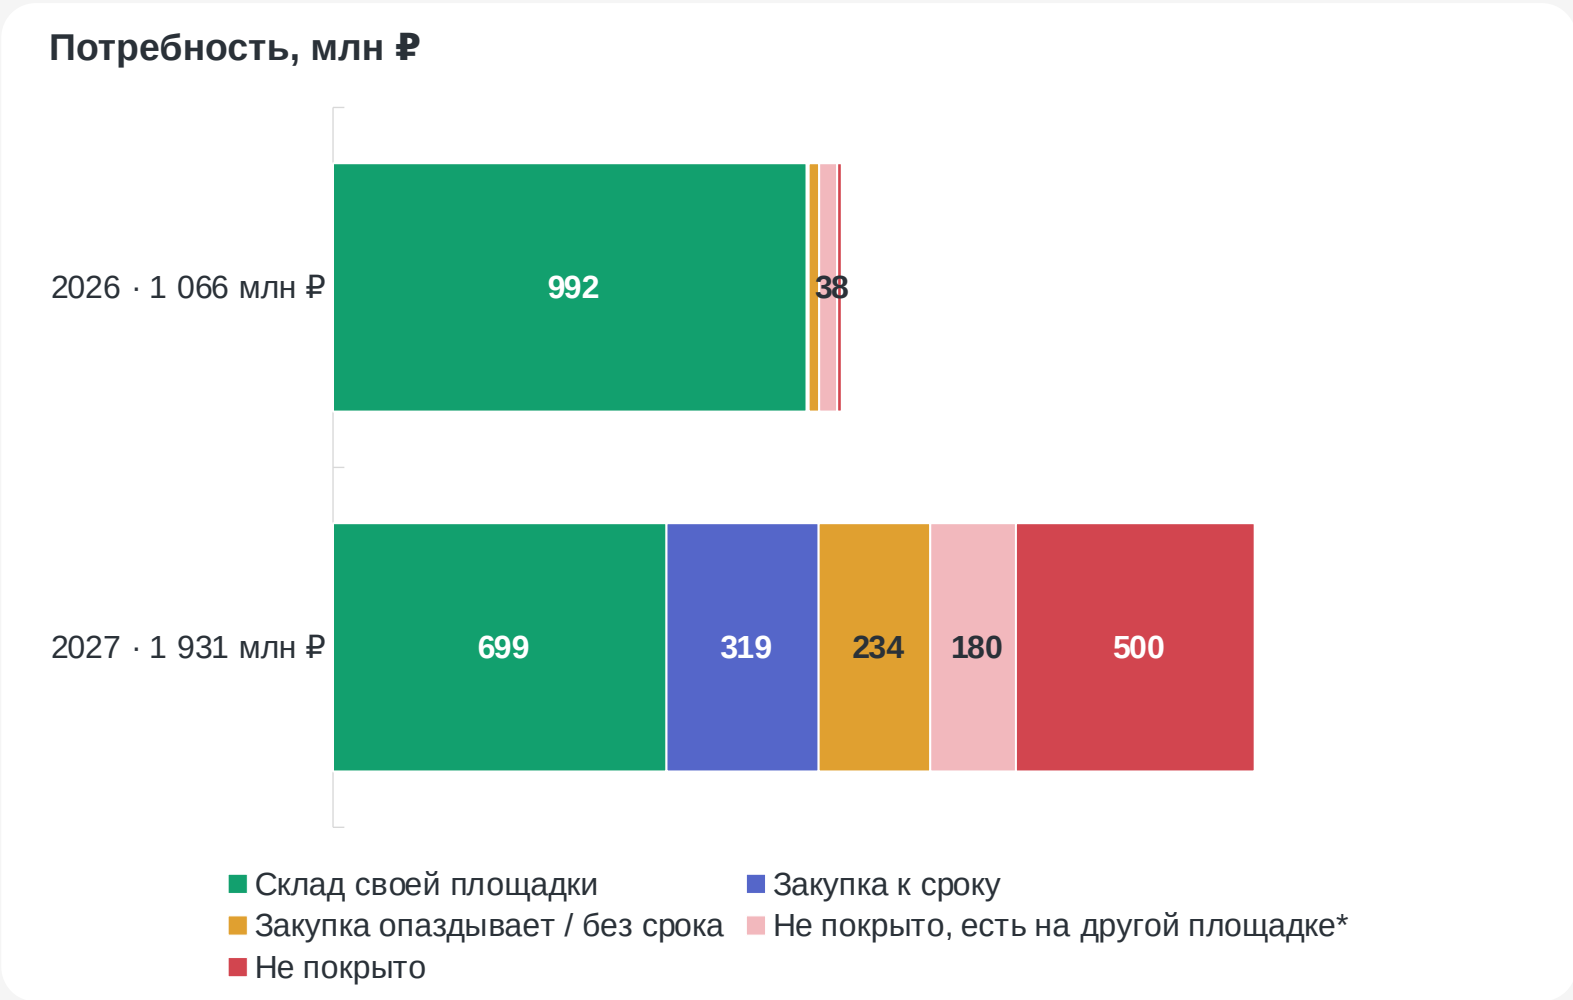

93%

обеспечено к сроку 2026
не покрыто 69 млн ₹ · с перемещением* до 97%

53%

обеспечено к сроку 2027
не покрыто 913 млн ₹ · с перемещением* до 62%


Что ещё можно успеть

- Успеем, если заказать сейчас: **511 млн ₹**
- Опоздаем до 3 мес.: **113 млн ₹**
- Опоздаем более чем на 3 мес.: **310 млн ₹**

Срок — медиана фактических поставок по коду.

* Перемещение между площадками ограничено: в обеспеченность не входит, это возможность улучшения (запас другой площадки сверх её потребности).

Обеспеченность по площадкам

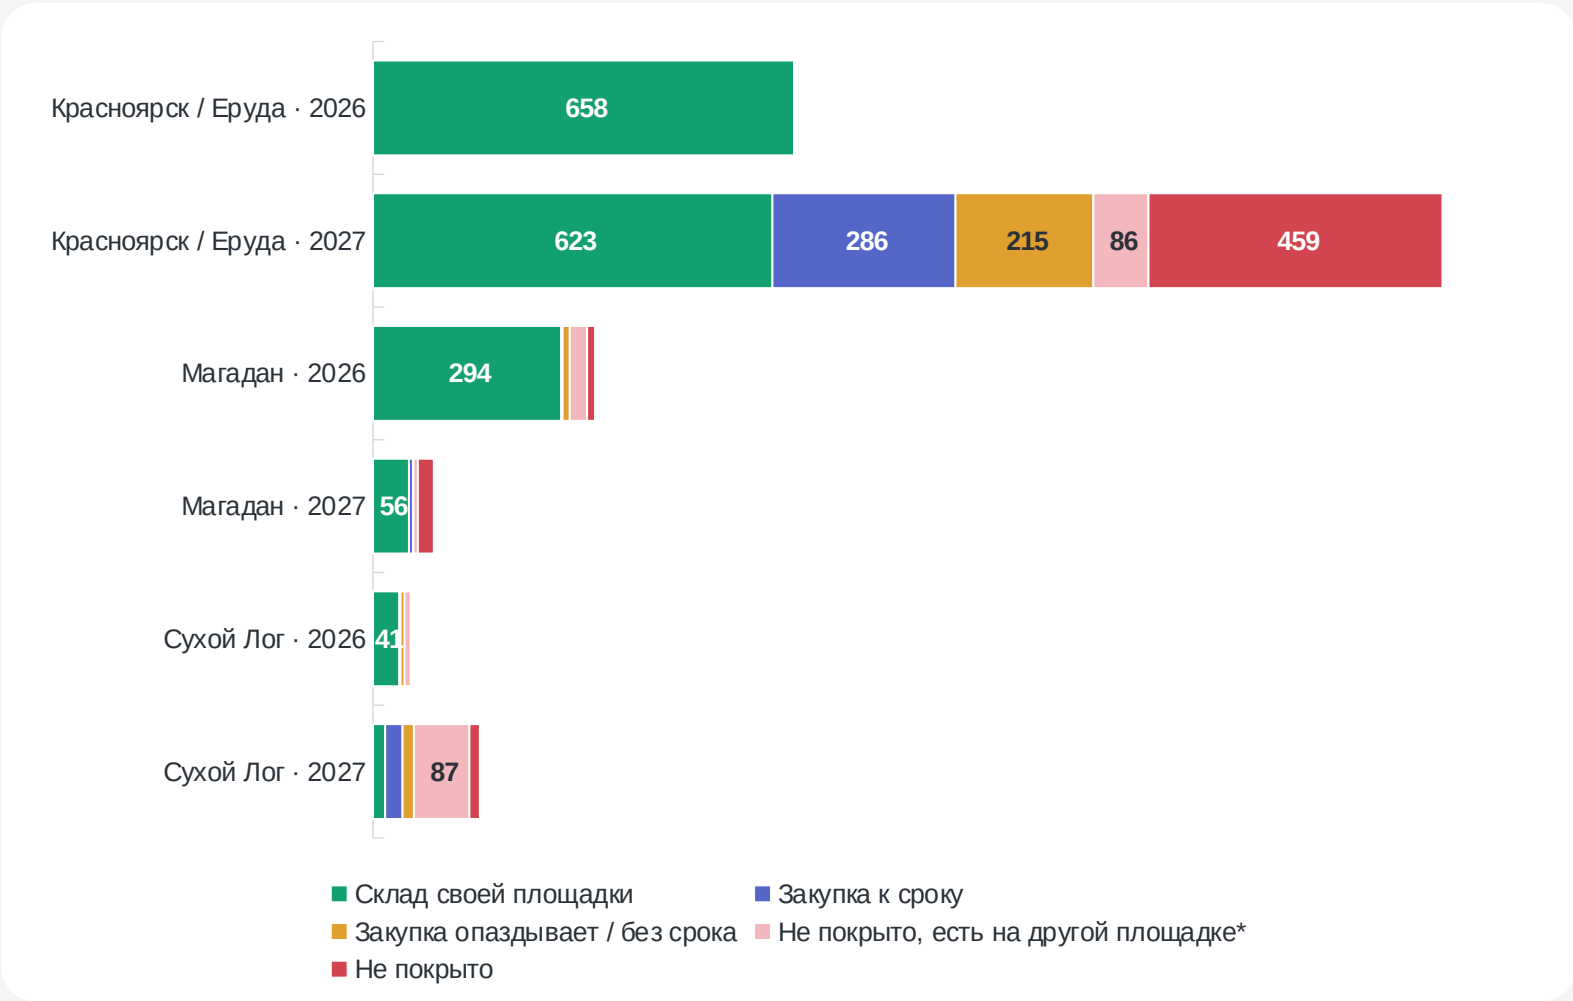

Площадка	2026	2027	Перем. *	Не покр. 27
Красноярск / Еруда	100%	54%	87	760
Магадан	85%	66%	34	33
Сухой Лог	73%	28%	96	121


83% дефицита 2027 — Красноярск

Больше всего не покрыто у WK-35 №16, WK-35 №17, WK-35 №07, WK-35 №15, WK-35 №18 — 538 млн ₽. Крупнейшая позиция — ковш K1839 (164 млн ₽).

Сухой Лог почти без своего запаса: обеспечено 39%; перемещением* можно улучшить ещё до 96 млн ₽.

* Перемещение между площадками ограничено: в обеспеченность не входит, это возможность улучшения (запас другой площадки сверх её потребности).


Обеспеченность 2027 по бортам

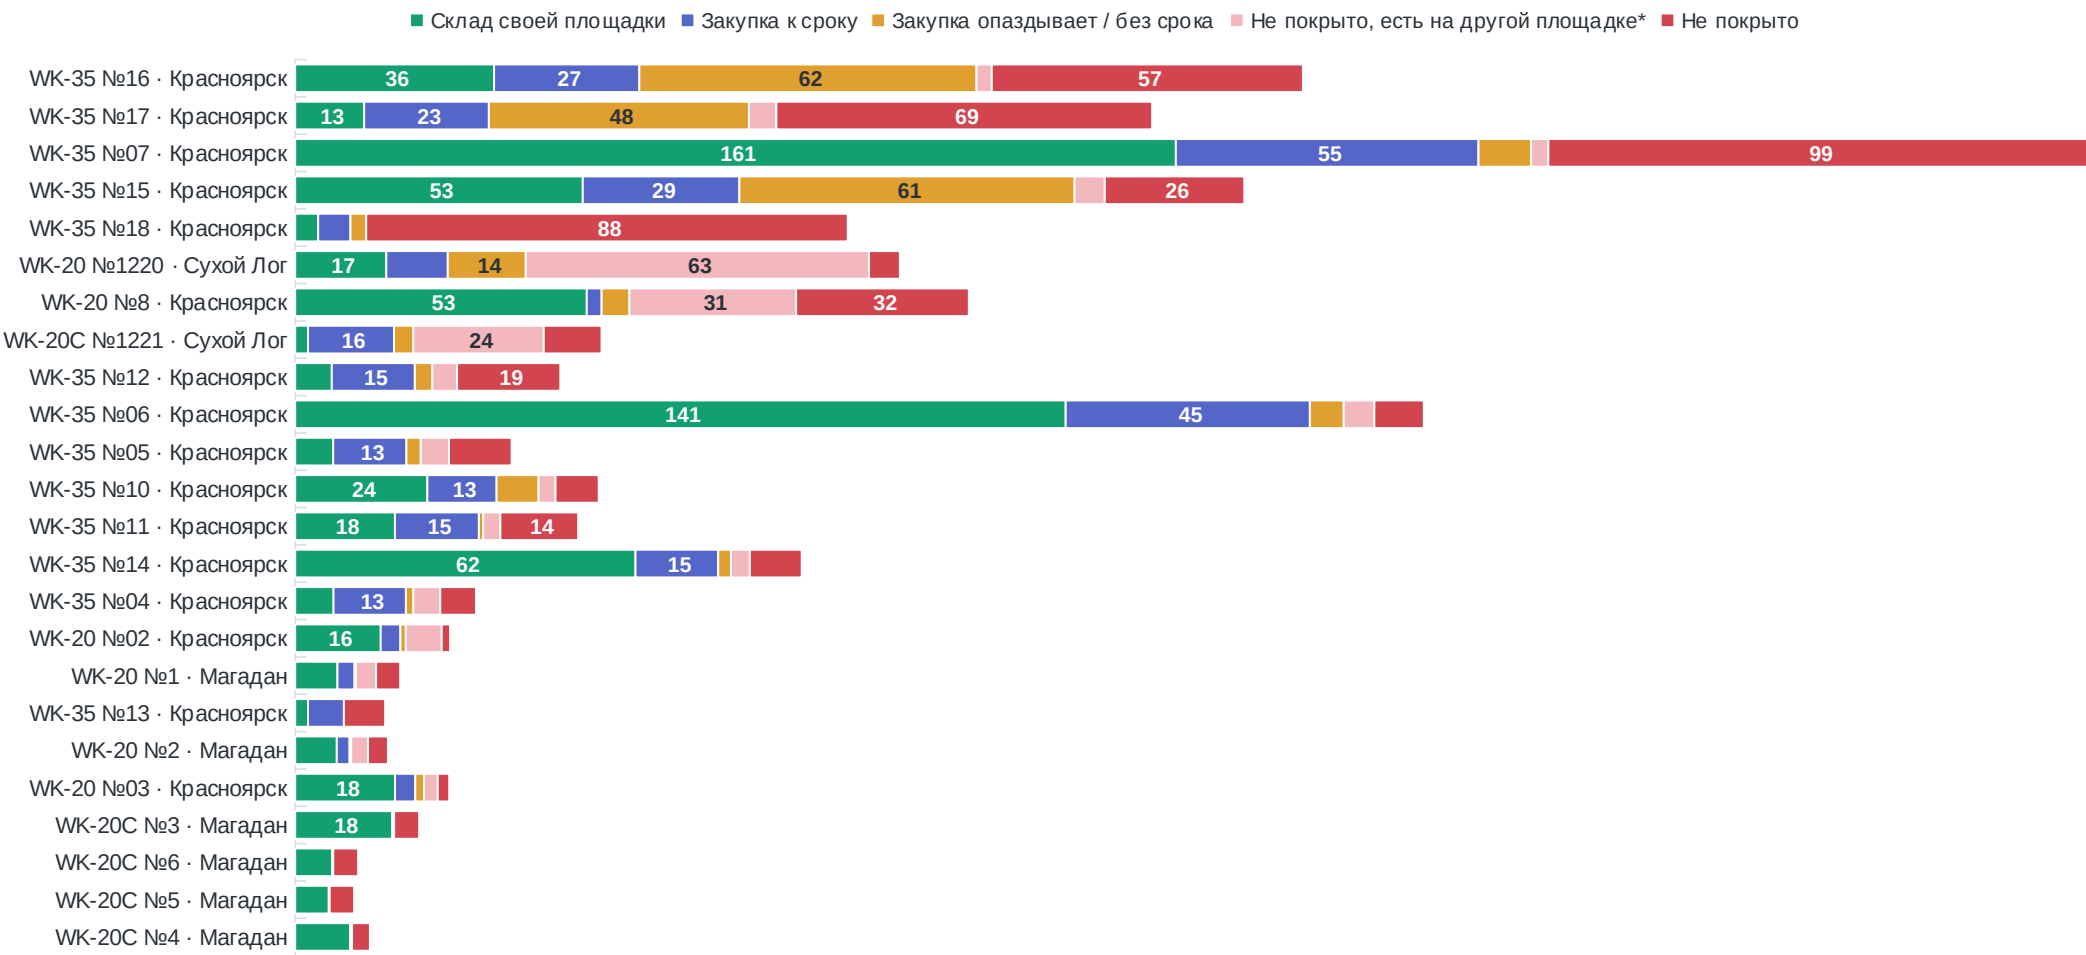

* Перемещение между площадками ограничено: в обеспеченность не входит, это возможность улучшения (запас другой площадки сверх её потребности).

Видит ли закупка потребность 2027

2027 по признаку, млн ₹

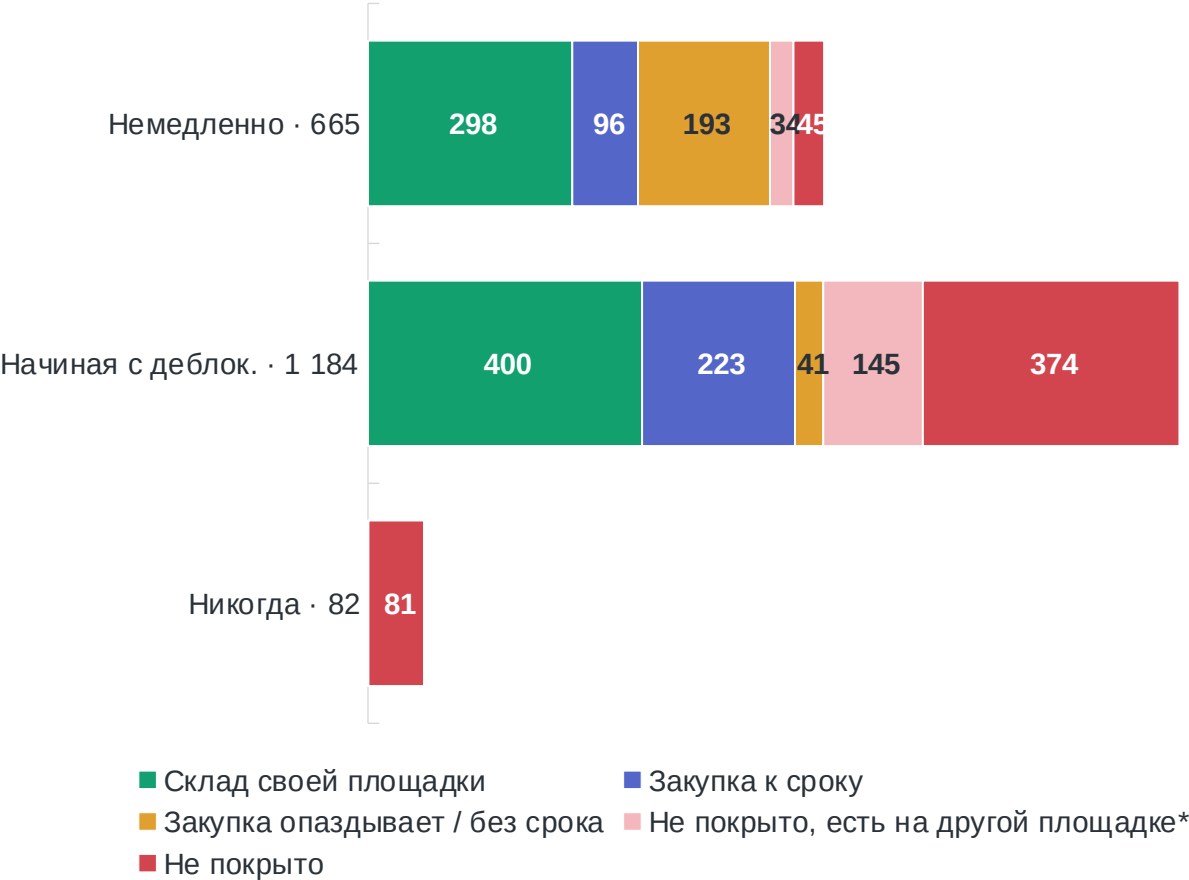

1 184 млн ₹

закупка не видит до деблокирования
из них не покрыто 561 млн ₹

82 млн ₹

строки «Никогда»
в заявку не попадут совсем

Что сделать

- Деблокировать заказы 2027 с длинными позициями раньше — с запасом на срок поставки.
- Либо перевести такие строки на «Немедленно».
- Строки «Никогда» проверить: реальная ли это потребность.

* Перемещение между площадками ограничено: в обеспеченность не входит, это возможность улучшения (запас другой площадки сверх её потребности).

Критичные позиции дефицита

ЕКМТР	Наименование	Потребн.	Не покрыто, млн ₽	Срок, дн.	Нужно с	Заказать до	Вывод
976755	Ковш в сборе K1839.01.00, TZ	4	163,6	262	01.11.2026	14.04.2026	не успеем
975783	Вал поворота вертикальный K1801.07.01.00, TZ	20	77,8	276	04.01.2027	12.06.2026	не успеем
1116816	Каток опорный K1801.18.03.00, TZ	80	63,7	276	20.06.2027	12.10.2026	успеем заказать
920820	Стакан фильтрующий K1838.22.01, TZ	2 808	53,1	395	01.10.2026	01.03.2026	не успеем
1195742	Стрела K1801.03.15.00, TZ	1	51,8	276	01.03.2027	29.05.2026	не успеем
948715	Канат подъема K1801.05.10.00, TZ	292	30,4	276	25.08.2026	22.07.2026	не успеем
976494	Насос пневматический 1904, TZ	48	28,7	174	18.07.2026	02.02.2026	срок прошёл
961124	Коронка зубца K1802.01.10.00-12, TZ	1 545	28,1	302	10.09.2026	02.02.2026	не успеем
1233003	Канат подъемный K1627.05.04, TZ	82	21,7	276	30.08.2026	27.11.2025	срок прошёл
953399	Пластина гусеничной ленты K1605.18.04.01, TZ	44	21,2	276	21.10.2026	29.10.2026	успеем заказать
975552	Каток опорный K1605.18.03.00, TZ	42	20,6	276	06.07.2026	03.10.2025	срок прошёл
961123	Зубцедержатель K1802.01.10.00-11, TZ	302	17,0	285	19.10.2026	13.07.2026	не успеем

Заказать сегодня

159

позиций ещё успеваем
если заказать сейчас

511

млн ₹ — стоимость пакета

424

млн ₹ — уже не успеть
нужны аналоги, перенос сроков или
ремонт узла

ЕКМТР	Наименование	Не покрыто, млн ₹	Ещё успеем, млн ₹	Срок, дн.
1116816	Каток опорный K1801.18.03.00, TZ	63,7	63,7	276
975783	Вал поворота вертикальный K1801.07.01.00	77,8	59,9	276
948715	Канат подъема K1801.05.10.00, TZ	30,4	28,7	276
953399	Пластина гусеничной ленты K1605.18.04.01	21,2	21,2	276
1233003	Канат подъемный K1627.05.04, TZ	21,7	20,6	276
976494	Насос пневматический 1904, TZ	28,7	20,2	174
975551	Вал приводной (к-т) K1605.18.02.00, TZ	16,1	16,1	276
1230357	Колесо натяжное в сборе K1842.18.05.00,	15,0	15,0	278
920820	Стакан фильтрующий K1838.22.01, TZ	53,1	14,5	395
976506	Реле потока DWE-FGR200G34A3TS75L, TZ	13,4	13,4	231

«Ещё успеем» — часть дефицита, потребность по которой наступает позже срока поставки; остальное уже не закрыть заказом.

Запасы, закупки и подрядчики

Склад WK, график поставок, сроки и МТР подрядчика
(УСО)



05

Запасы WK по площадкам

2,27

млрд ₹ — Красноярск / Еруда
801 кодов · 65% запаса

1,08

млрд ₹ — Магадан
459 кодов · 31% запаса

0,16

млрд ₹ — Сухой Лог
193 кодов · 5% запаса

3,52

млрд ₹ — весь запас WK
ограничено 1,4 млн ₹

Крупнейшие склады, млн ₹



Запас и потребность 2026–2027, млн ₹

Площадка	Запас	Нужно	Свой склад	Перем.*	Не покр.
Красноярск	2 274	2 330	1 281	87	763
Магадан	1 076	441	350	34	83
Сухой Лог	165	226	60	96	137

Запас лежит не там, где работы. Магадан держит 31% запаса при 15% потребности; Сухой Лог со своего склада закрывает 60 млн ₹ из 226.

* Перемещение между площадками ограничено: в обеспеченность не входит, это возможность улучшения (запас другой площадки сверх её потребности).

Возможность перемещения между площадками

Откуда → куда можно, млн ₽

	В Красноярск	в Магадан	в Сухой Лог	всего из
из Красноярск	—	33,3	65,6	98,9
из Магадан	83,8	—	30,6	114,5
из Сухой Лог	3,4	0,5	—	3,9
всего в	87,3	33,8	96,2	217,3

до 217 млн ₽

можно улучшить перемещением*
в обеспеченность не входит · 2027: 53% → до 62%

Крупнейшие позиции, которые есть на другой площадке

ЕКМТР	Наименование	Маршрут, шт	млн ₽
961124	Коронка зубца K1802.01.10.00-12, Т	Маг. → Красн.: 498, СЛ → Красн.: 24	28,1
953399	Пластина гусеничной ленты K1605.18	Маг. → Красн.: 35	21,2
961123	Зубцедержатель K1802.01.10.00-11,	Маг. → Красн.: 76	17,0
1170659	Круг роликовый K1601.13.00, TZ	Красн. → Маг.: 1	9,6
975558	Колесо переднее направляющее (натя	Красн. → СЛ: 2	9,5
901765	Защита межзубьевая K1623.01.12, TZ	Маг. → Красн.: 92	9,0
975552	Каток опорный K1605.18.03.00, TZ	Красн. → Маг.: 4	6,3
869417	Клапан продувной в сборе SDU04A00H	Красн. → СЛ: 22	5,8
1083952	Подшипник K1602.03.10.03, TZ	Красн. → СЛ: 4	5,6
975529	Вал поворотный K1605.07.01.00, TZ	Красн. → Маг.: 2	5,3

* Перемещение между площадками ограничено: в обеспеченность не входит, это возможность улучшения (запас другой площадки сверх ее потребности).

Закупки: график поставок и сроки

460

кодов в закупке
310 с потребностью 26–27

6 575

ед. ещё поставить
в пути 89 ед.


1 310

ед. просрочено
месяц поставки прошёл


276 дн.

медианный срок поставки
по 460 кодам

Открытое количество по месяцу поставки, ед.

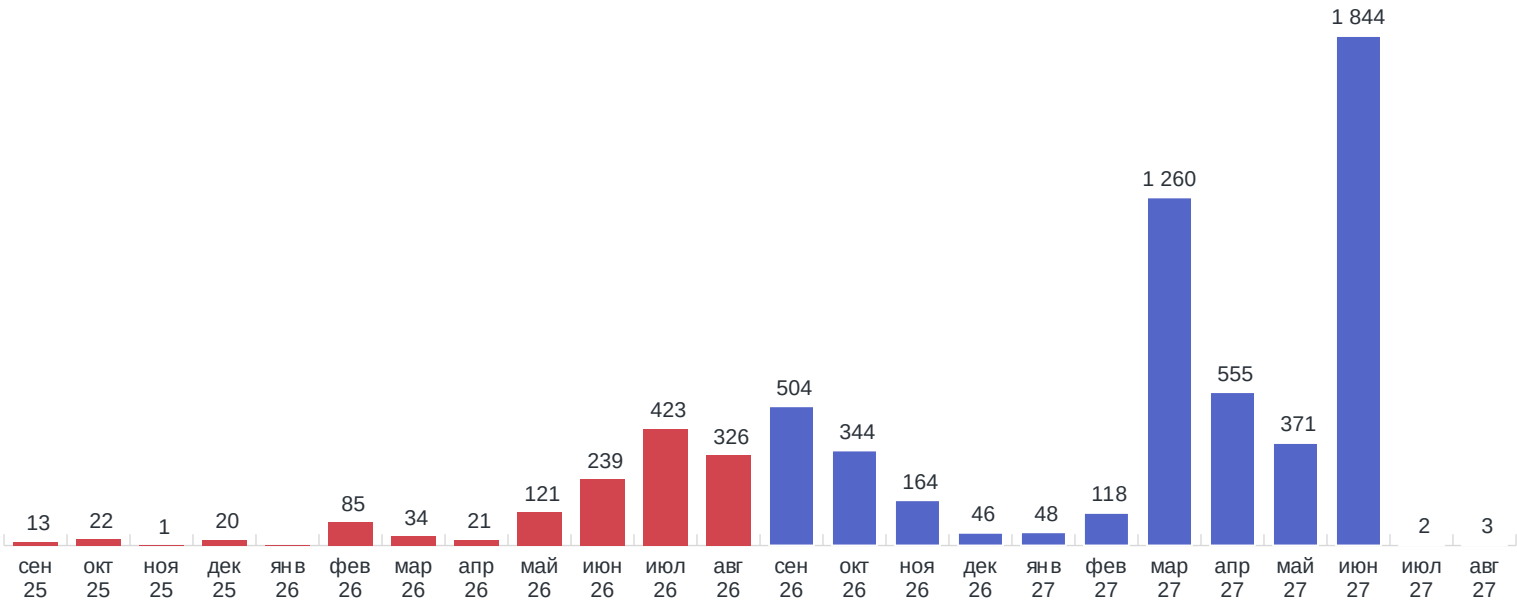


Фактический срок поставки, кодов

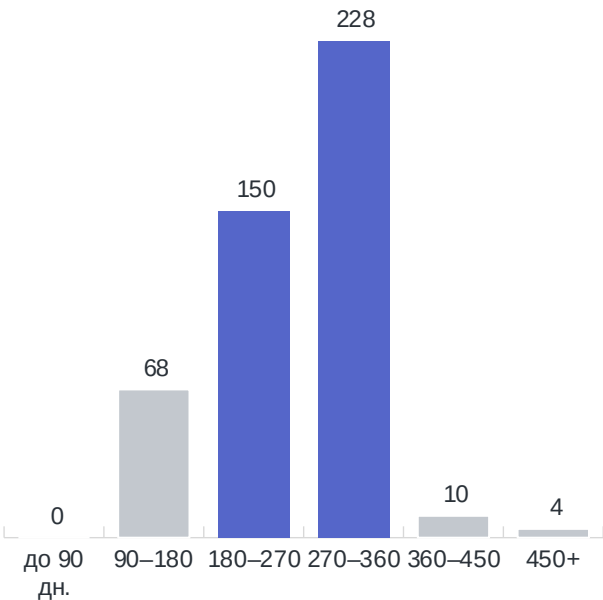

МТР подрядчика (УСО)

УСО по годам, млн ₹

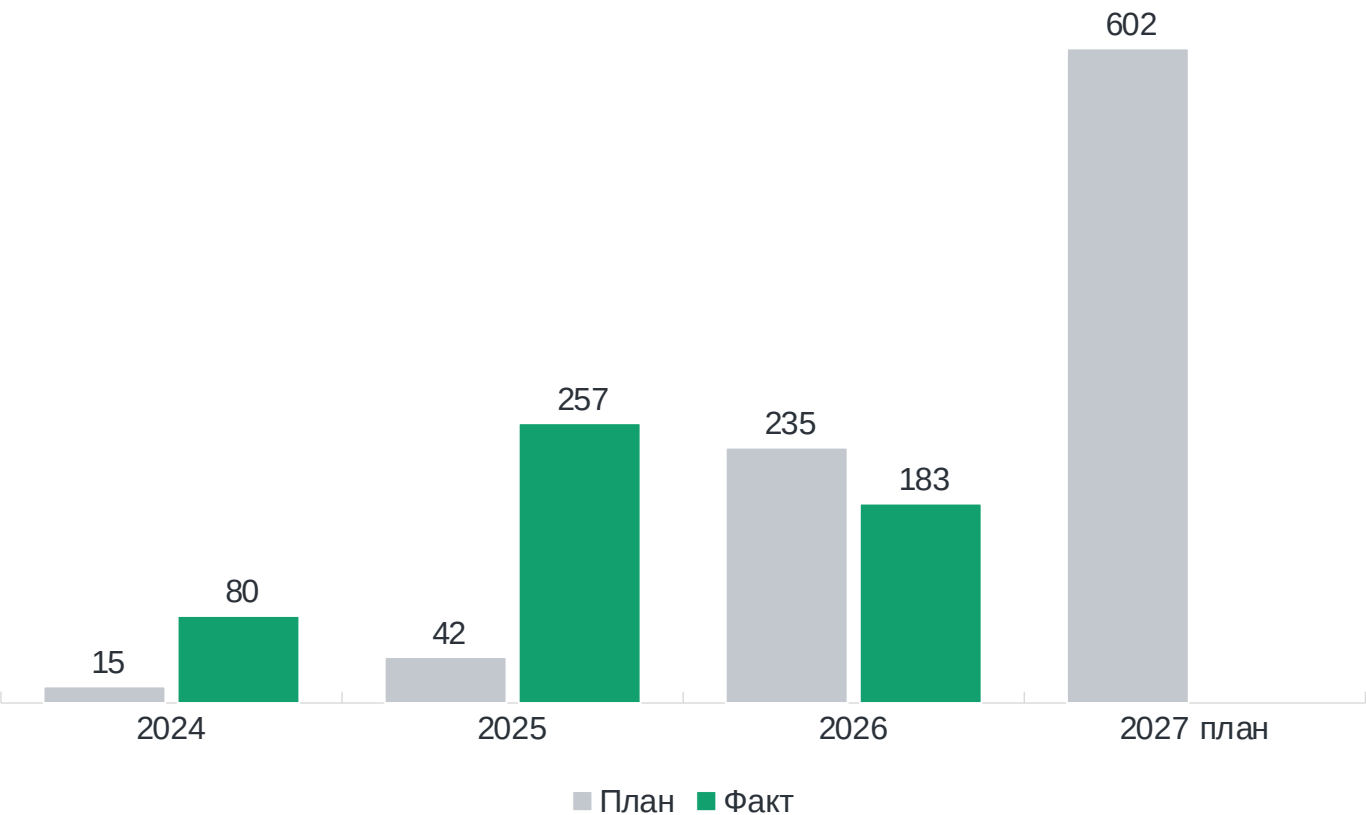

Площадка	2024	2025	2026	2027
Красноярск / Еруда	5 / 43	5 / 95	125 / 86	74
Магадан	11 / 31	20 / 136	107 / 88	528
Сухой Лог	0 / 7	17 / 26	2 / 10	0

план / факт, млн ₹

План МТР подрядчика заполнен не полностью

В 2024–2025 факт УСО в 5 и 6 раз выше плана строк МТР подрядчика. Процент исполнения по УСО не показателен — смотрите факт и открытый остаток.

2027: 528 млн ₹ из 602 — Магадан.


АВТОВЫВОДЫ И КОНТРОЛЬ ОТДЕЛОВ

Схема автоматических выводов, выводы по площадкам, контроль планирования, исполнения и бюджетирования



06

Схема автоматических выводов

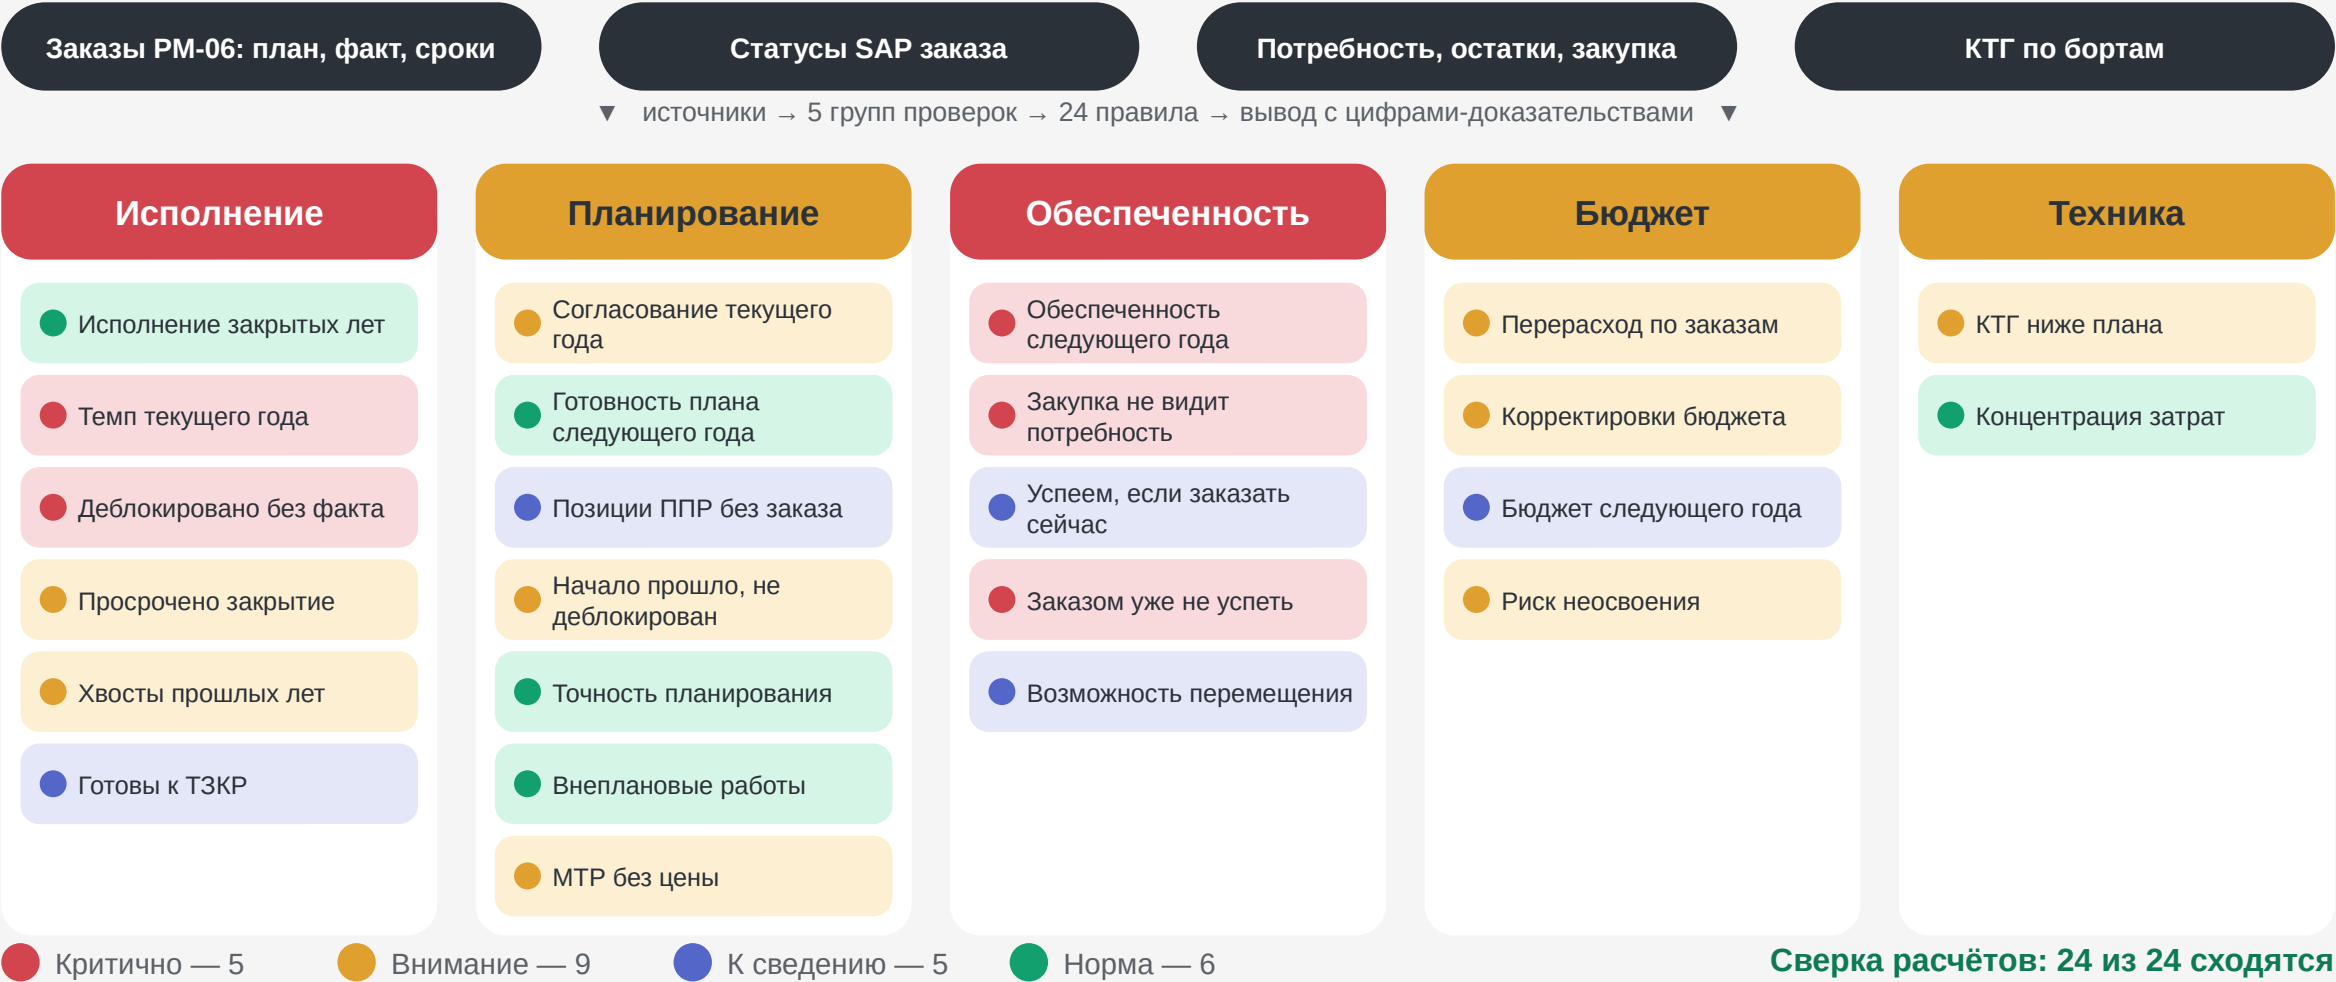

АВТОВЫВОДЫ: что требует решения

Критично Исполнение Темп текущего года 2026: освоено 54% плана при 70% прошедшего года; по заказам с началом до 09.2026 — 70%. 3 962 млн ₽ 2 134 млн ₽ 70% план года факт доля года	Критично Исполнение Деблокировано без факта 111 заказов 2026 на 601 млн ₽ деблокированы, но без факта и подтверждений (15% плана). 601 млн ₽ 15% план доля плана	Критично Обеспеченность Обеспеченность следующего года 2027: обеспечено к сроку 53% потребности (1 018 млн ₽ из 1 931 млн ₽), не покрыто 913 млн ₽. 1 931 млн ₽ 1 018 млн ₽ 913 млн ₽ потребность обеспечено не покрыто
Критично Обеспеченность Закупка не видит потребность 2027: 1 184 млн ₽ потребности «Начиная с деблок.» закупка не видит до деблокирования; из них не покрыто 561 млн ₽. 1 184 млн ₽ 561 млн ₽ потребность не покрыто	Критично Обеспеченность Заказом уже не успеть 472 млн ₽ дефицита заказом уже не закрыть: опоздание до 3 мес. 113 млн ₽, больше 3 мес. 310 млн ₽, срок прошёл 48 млн ₽ — аналоги, перенос или ремонт узла. 113 млн ₽ 310 млн ₽ 48 млн ₽ до 3 мес. > 3 мес. срок прошёл	Внимание Бюджет Риск неосвоения 2026: 532 млн ₽ плана (13%, 131 заказ) — базисное начало наступило, а факта нет. Ещё 1 183 млн ₽ без факта приходится на заказы с началом до конца года. 532 млн ₽ 13% 1 183 млн ₽ наступило, без факта доля плана впереди

Один набор правил — разные ответы по площадкам

Группа	Правило	Весь парк	Красноярск	Магадан	Сухой Лог
Исполнение	Исполнение закрытых лет	Норма	Норма	Внимание	Внимание
Исполнение	Темп текущего года	Критично	Внимание	Критично	Внимание
Исполнение	Деблокировано без факта	Критично	Критично	Критично	Внимание
Исполнение	Просрочено закрытие	Внимание	Внимание	Внимание	Внимание
Исполнение	Хвосты прошлых лет	Внимание	Внимание	Норма	Внимание
Исполнение	Готовы к ТЗКР	К сведению	Норма	К сведению	Норма
Планирование	Согласование текущего года	Внимание	Внимание	Внимание	Внимание
Планирование	Готовность плана следующего года	Норма	Норма	Внимание	Норма
Планирование	Позиции ППР без заказа	К сведению	К сведению	К сведению	К сведению
Планирование	Начало прошло, не деблокирован	Внимание	Внимание	Внимание	Внимание
Планирование	Точность планирования	Норма	Норма	Внимание	Внимание
Планирование	Внеплановые работы	Норма	Норма	Норма	Норма
Планирование	МТР без цены	Внимание	Внимание	Норма	Внимание
Обеспеченность	Обеспеченность следующего года	Критично	Критично	Критично	Критично
Обеспеченность	Закупка не видит потребность	Критично	Критично	Критично	Критично
Обеспеченность	Успеем, если заказать сейчас	К сведению	К сведению	К сведению	К сведению
Обеспеченность	Заказом уже не успеть	Критично	Критично	Критично	Критично
Обеспеченность	Возможность перемещения	К сведению	К сведению	К сведению	К сведению
Бюджет	Перерасход по заказам	Внимание	Внимание	Внимание	Внимание
Бюджет	Корректировки бюджета	Внимание	Норма	Внимание	Внимание
Бюджет	Бюджет следующего года	К сведению	К сведению	К сведению	К сведению
Бюджет	Риск неосвоения	Внимание	Норма	Критично	Норма
Техника	КТГ ниже плана	Внимание	Внимание	Норма	Норма
Техника	Концентрация затрат	Норма	Норма	Внимание	Внимание

Контроль планирования: план 2027 и оперативный план

82%

плана 2027
согласовано
2 277 из 2 783 млн ₹

0%

утверждено в
годовом (УТВГ)
плановые заказы
АРР1

770

позиций ППР без
заказа
1 175 млн ₹ вне плана

65

начало прошло,
не деблок.
60 млн ₹ 2026


53%

точность плана
2025
факт в ±20% плана
заказа


14%

внеплановые 2025
доля факта AVS1


Цепочка согласования 2027, млн ₹

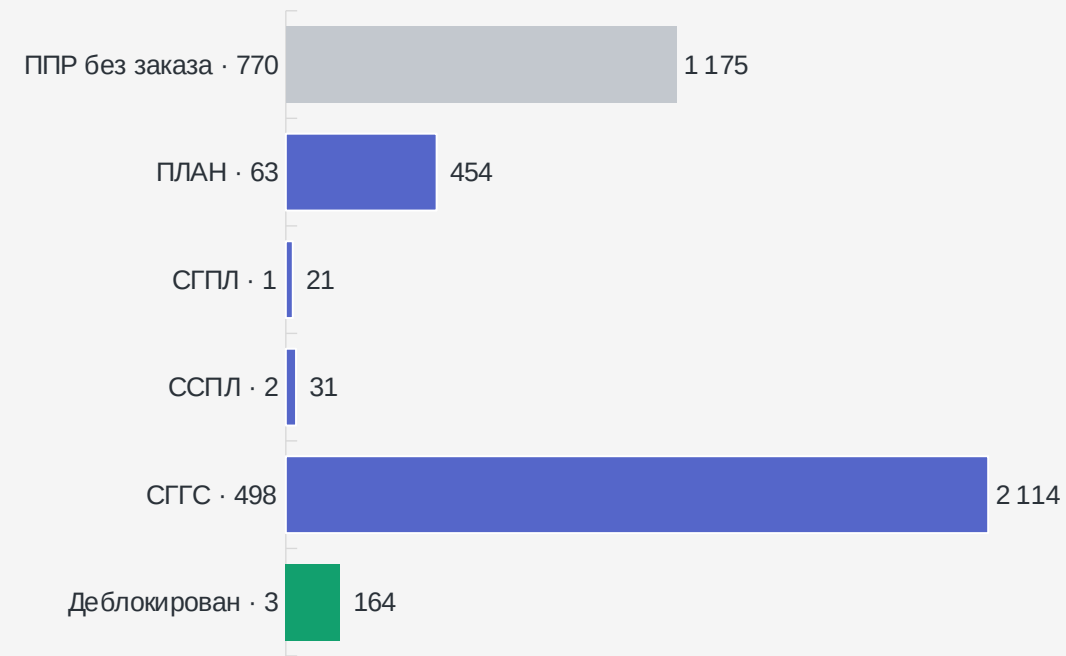


Статусы плана: доля плана со статусом

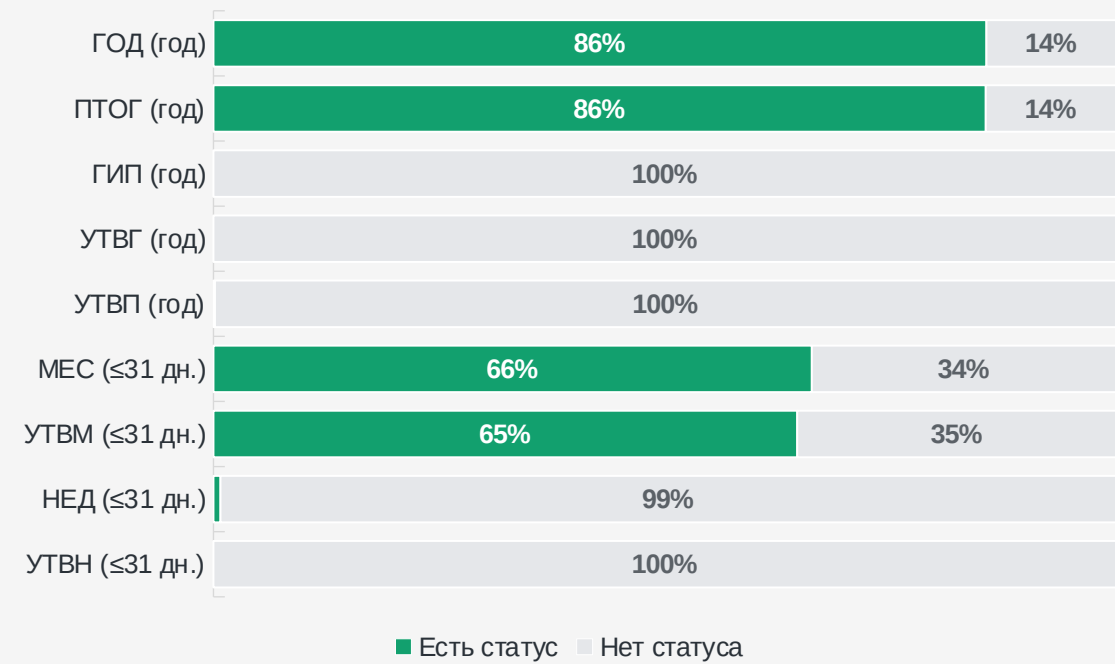

Контроль исполнения 2026: воронка и освоение



Воронка 2026: план по стадиям, млн ₽

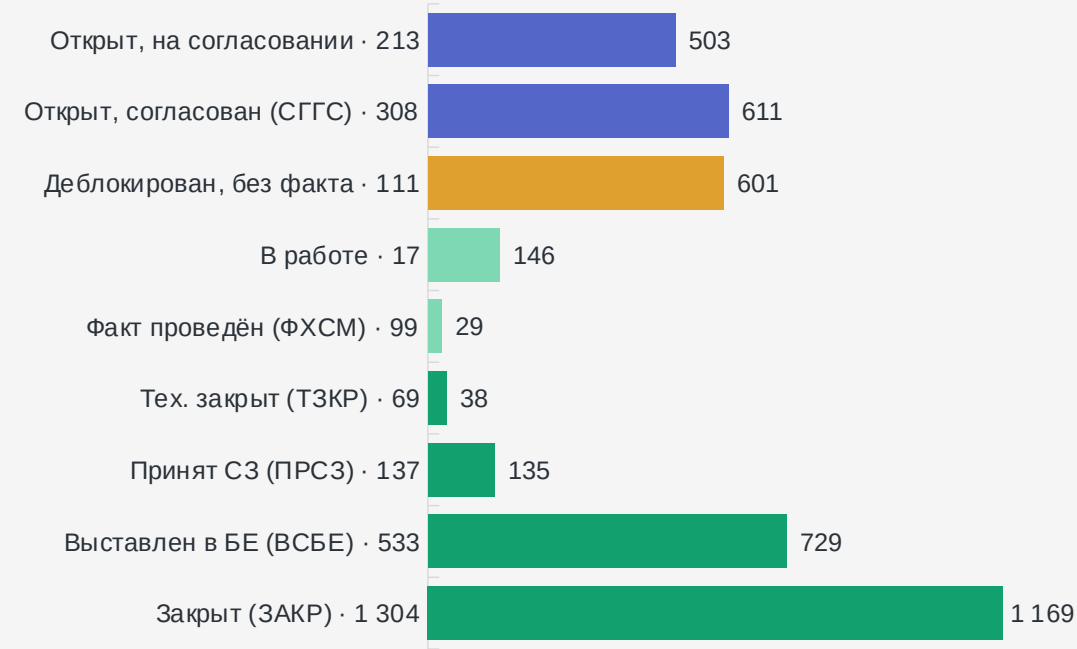

План и факт 2026 нарастающим, млн ₽



Деблокированы без факта: крупнейшие заказы 2026

Заказ	Текст заказа	Борт	Площадка	Начало	Конец	План, млн ₽
1102298470	Ходовая часть	WK-20 №1	Магадан	06.07.2026	12.08.2026	210,4
1102358430	Опорно-поворотное устройство	WK-20 №1	Магадан	06.07.2026	12.08.2026	80,1
4000051425	Замена ковша WK-35 №12	WK-35 №12	Красноярск	01.11.2026	30.11.2026	78,9
4000056379	Замена рукояти WK-20 №3	WK-20 №03	Красноярск	01.01.2026	30.10.2026	43,1
4000065243	Замена Редук.хода-35№4	WK-35 №04	Красноярск	01.09.2026	30.09.2026	26,6
1200436385	КР подъема	WK-20 №1	Магадан	06.07.2026	12.08.2026	22,5
1200360596	Ремонт головных блоков	WK-20 №1	Магадан	01.08.2026	02.08.2026	14,7
1101938098	Капитальный ремонт ковша	WK-20C №6	Магадан	11.12.2026	12.12.2026	12,5

Что сделать: восемь крупнейших заказов — 489 млн ₽, 81% суммы. Провести факт, перенести сроки или закрыть; в отчёте — «Контроль отделов»
→ «Исполнение», фильтр «Факт по заказу: нет факта».

Контроль бюджетирования: план, факт, статусы

94%

факт / план 2024

104%

факт / план 2025

532

млн ₴ риск неосвоения
13% плана 2026, 131 заказ.

92

млн ₴ перерасход 2026
210 заказов


23

ТРКБ: нужна корректировка заказы 2026–2027


78%

УСО факт / план 2026
МТР подрядчика

План и факт МТР и УСО по годам, млн ₴

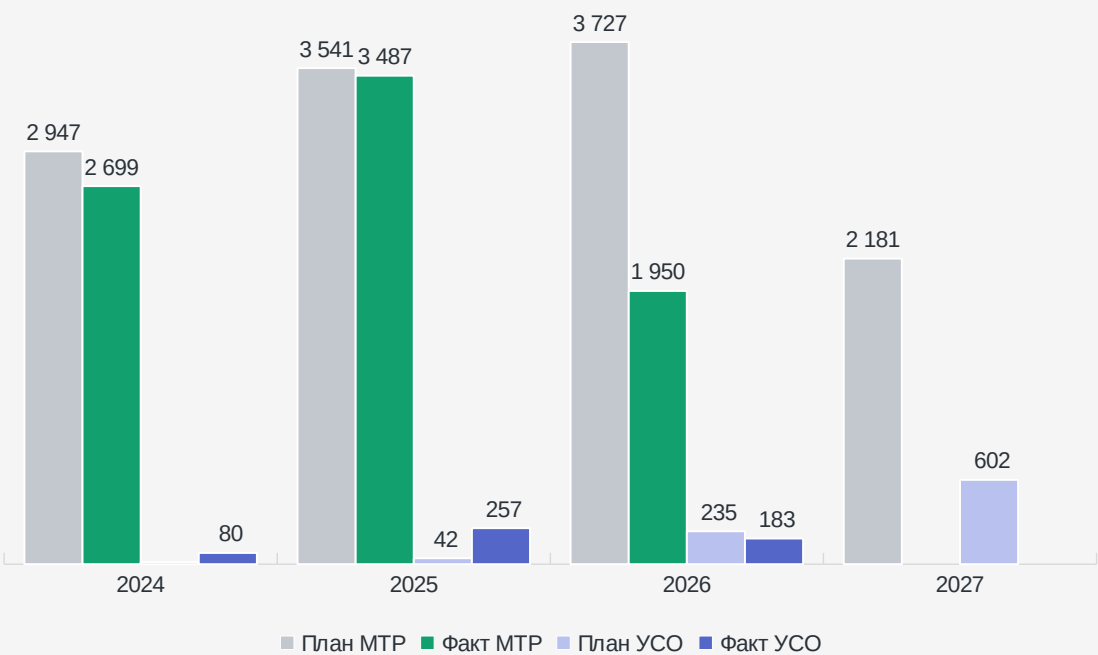

Бюджетные статусы плановых заказов: доля плана

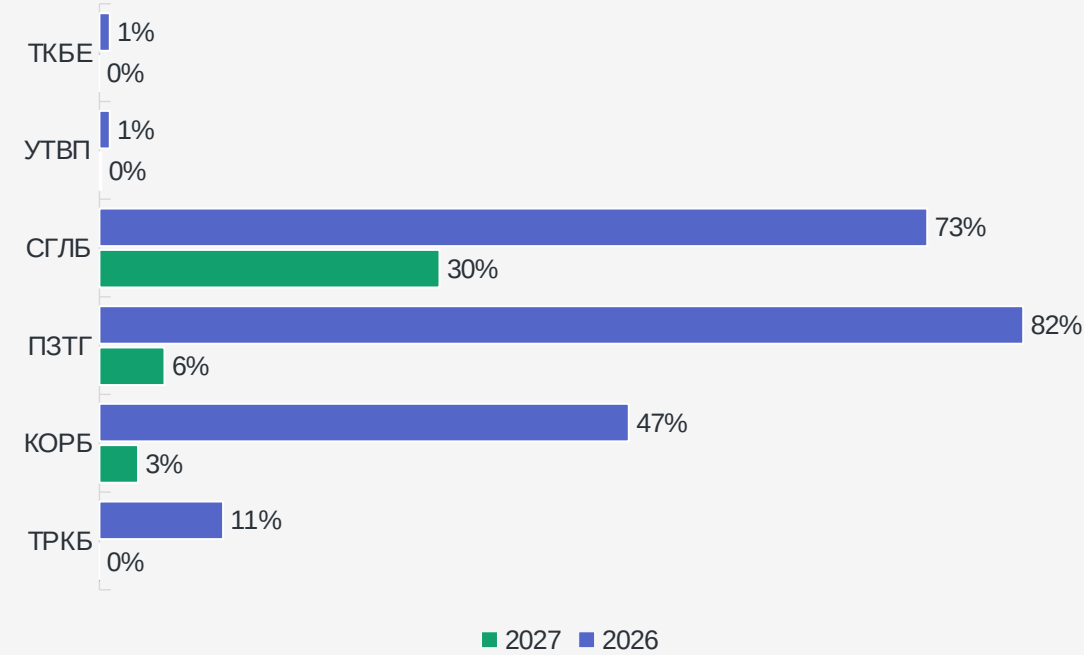

Справочники и качество данных

Каталог, кодификация, взаимозаменяемость и
ограничения расчёта



07

Каталог, кодификация и взаимозаменяемость

3 042

позиций прайса
ДП
УСО — 3 038

42%

кодифицировано
ЕКМТР
1 279 позиций; 103
неоднозначно


1 763

позиций без
ЕКМТР
нет расхода, остатка и
закупки

800

позиций в дереве
узлов
механизм → узел →
деталь

Кодификация прайса

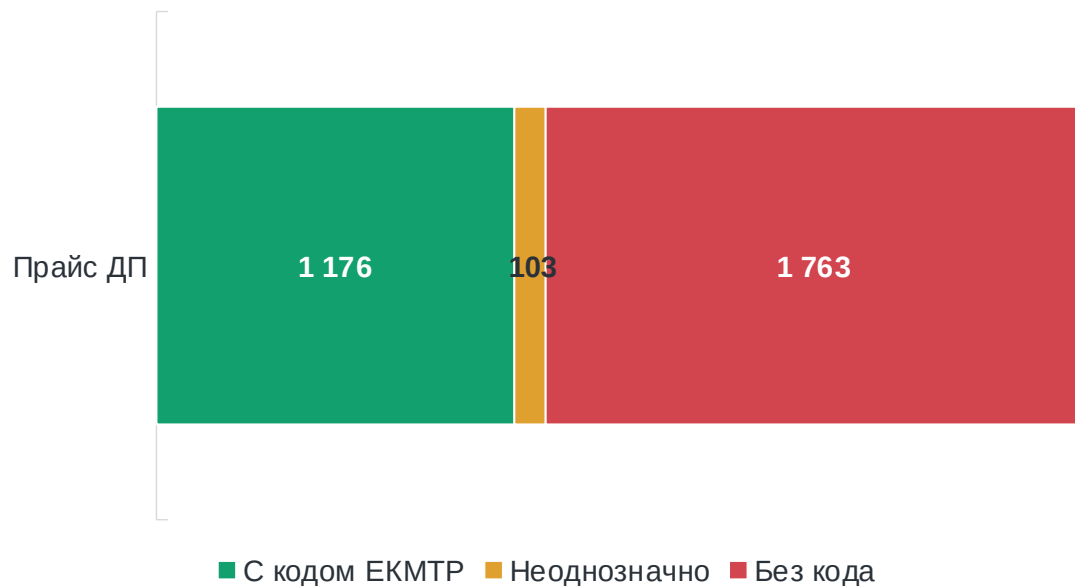

Ведомость взаимозаменяемости

- **1 533 групп** замен, 2 199 деталей
- **1 747 связей** между книгами WK-20, WK-20C и WK-35
- **187 строк** с комментарием — ограничение применения

Прямые замены видны в обеспеченности. Транзитивные замены и пересчёт склада «как будто замена» сознательно не делаются.

Ограничения данных и расчёта

Статус — на дату выгрузки

Стадия заказов 2024–2025 взята из годовых выгрузок РМ-06. Если заказ закрыли позже, в презентации он может быть «в работе».

Запас по площадкам

Площадка склада — по заводу строки остатков; склады Иркутской области отнесены к Сухому Логу. Склад покрывает только свою площадку; перемещение ограничено и показано как возможность*, не как покрытие.

Позиции ППР и копии

1 175 млн ₽ позиций ППР 2027 и неисполненный план оригиналов БЕ исключены из плана по правилам РМ-06.

Срок поставки — до месяца

Обеспеченность считается по месяцу: приход внутри месяца потребности считается успевающим.

Парк и книги

В парке 28 бортов после схлопывания дублей. У 4 бортов нет книги; №1228 есть в заказах, но нет в витрине «Парк».

Стоимость закупок — в рублях

«Общая стоимость» выгрузки закупки — в рублях: у позиций прайса ДП это цена в юанях × курс пересчёта ≈ 12,48 ₽/¥; валюта документа (ZCNY, ZUSD) — справочно.

Отдельно: 2026 — незавершённый год (факт на 14.09.2026); низкий % исполнения 2026 не означает отставания сам по себе.

Обновление данных — прямо в отчёте, без Python

Загрузить

Остатки (3 файла), РМ-06
M06_{площадка}_{год}.xlsx
— только изменившиеся,
МТР УСО

Пересобрать

График, статусы и стадии,
копии «Развития», ППМ,
контроль, обеспеченность,
ремонт, тексты

Сверить

«Сейчас / После
пересборки» и сверки
аналитики на новых данных

Применить

Сохраняется в браузере,
переживает перезагрузку;
плашка вверху отчёта

Выложить

Записать в папку отчёта на
диске (Chrome / Edge) или
архив data/ для всех

~3 с

разбор одной выгрузки РМ-06
в браузере, 20 МБ xlsx

0

расхождений с Python
витрины из полных
M06_1400/1200_2027

1,7 млн

сверенных значений
тест test_toro_rebuild.mjs

8 297

текстов заказов
из колонки «Заказ ·доп»

Загружать всё не нужно. Загруженные площадко-годы заменяют свои, остальные берутся из текущих данных; файл 1200 сам разводится на Вернинское и Сухой Лог по балансовой единице.

Python остаётся эталоном для каталога, LinkOne, базы знаний, КТГ и презентаций — они от выгрузок BW не зависят.

Двойная проверка расчётов и выводов

24 / 24

сверок сходятся — весь парк

9 223

показателя сверено в 35 контекстах

0

расхождений браузер ↔ Python

Сверки в отчёте

- 24 из 24 сверок сходятся для всего парка
- по каждой площадке — Красноярск 19/19, Магадан 19/19, Сухой Лог 19/19
- стадии = план + ППР + копии; площадки = итог; МТР + УСО = итог; сегменты обеспеченности; цепочка согласования; воронка; S-кривая

Независимый пересчёт

- вторая реализация на Python: заказы из строк графика и статусов ТОРО
- 9 223 показателя и уровни всех выводов в 35 контекстах (парк, площадки, модели, борта)
- тест пойман на намеренных ошибках ядра (пороги, правило копий, риск неосвоения)

Паритет браузер = Python

- пересборка в браузере совпала с Python по всем витринам
- на полных выгрузках РМ-06 и на выборке из настоящей выгрузки
- итоги по годам, площадкам и бортам = данным этой презентации (419 из 419)

Итог: каждая цифра отчёта и этой презентации получена двумя независимыми способами, и они совпали.

Выводы и что сделать

1

Закрыть хвосты 2026

111 деблокированных заказов на 604 млн ₽ без факта: провести факт, перенести или закрыть до конца года.

2

Ревизия согласования 2026

1 119 млн ₽ ещё на согласовании в сентябре — решить, что переходит в 2027.

3

Деблокировать 2027 раньше

1 184 млн ₽ потребности закупка не видит до ДЕБЛ при сроке поставки 276 дней.

4

Заказать сегодня

159 позиций на 511 млн ₽ ещё успеваем; по 424 млн ₽ — аналоги или перенос.

5

Просроченные поставки

1 310 ед. с прошедшим месяцем поставки — эскалация поставщикам.

6

Возможность перемещения

До 217 млн ₽ дефицита есть на других площадках. Перемещение ограничено — проверить, что реально согласовать и перевезти.

Методика и источники

Как считали

- Исполнение = факт / план МТР + УСО по заказам ТОРО WK.
- Позиции графика ППР без заказа SAP в план не входят.
- Оригинал БЕ с копией в «Развитии»: факт учитывается, неисполненный план — нет.
- Стадия заказа — по статусам РМ-06: ЗАКР > ТЗКР > ДЕБЛ > ОТКР.
- Площадка — по борту (вкладка «Парк»).
- Запас — по площадке склада (завод строки остатков).
- Обеспеченность: склад своей площадки, затем закупка с датой до потребности, по месяцам. Запас других площадок — только возможность улучшения*, в покрытие не входит.

Источники

- Выгрузки BW РМ-М06 2024–2027, площадки 1100, 1200, 1400 (2400 — по бортам)
- Статусы заказов РМ-06 (ТОРО/pm06_meta)
- КТГ — витрина ТОРО ktg.json
- Остатки и ограниченный запас на 14.09.2026
- Закупка ALL «Развитие» на 11.09.2026
- МТР подрядчика — rawdata/УСО; прайсы ДП и УСО; ведомость взаимозаменяемости
- Тексты заказов — колонка «Заказ ·доп» РМ-06; автовыводы — 24 правила ядра отчёта



Развитие

Акционерное
общество

Вопросы и обсуждение

Экскаваторы WK · данные на 14.09.2026
